

공약사업 추진 실적

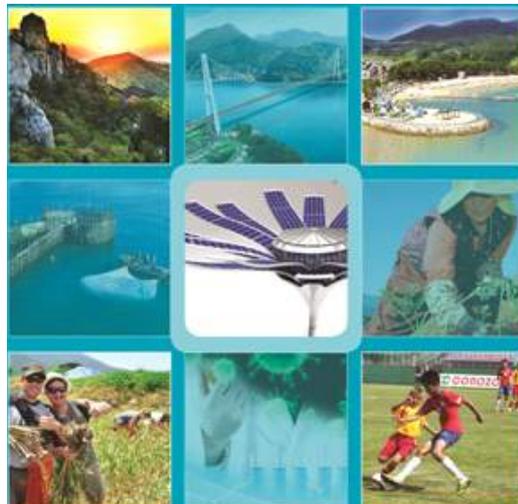

남해군
Namhae-Gun

목 차

I. 공약사업 현황 1

II. 부서별 공약사업 목록 2

III. 부서별 추진실적 현황 7

1. 기획예산담당관7
2. 관광진흥담당관15
3. 행정과29
4. 주민복지과41
5. 재무과51
6. 문화청소년과59
7. 지역활성과79
8. 환경녹지과95
9. 해양수산과111
10. 도시건축과125
11. 건설교통과129
12. 보건소145
13. 농축산과151
14. 농촌활력과165
15. 농업기술과169
16. 체육시설사업소175

IV. 부 록 184



I 공약사업 현황

□ 분야별 추진 현황

구분	계	산업경제 (I)	문화관광 (II)	도시환경 (III)	보건복지 (IV)	지방자치 (V)
건수	90	25	19	18	12	16
추진율(%)	29.8	32.3	12.9	24.2	24.0	56.6

□ 추진시기별 현황

구분	계	단기	중기	장기	비고
건수	90	65	16	9	
추진율(%)	29.8	35.9	15.7	11.1	

□ 부서별 추진 현황

부서	건수	완 료			추진 중			미추진 (보류·폐기)	추진율 (%)
		소계	완료	이행 후 계속추진	소계	정상	일부추진		
합 계	90	8	4	4	82	71	11	0	29.8
기획예산담당관	2	1		1	1		1		55.0
관광진흥담당관	7				7	7			14.3
행정과	6	2	1	1	4	4			78.3
주민복지과	3	1	1		2	2			43.3
재무과	3				3	1	2		15.0
문화관광과	14				14	11	3		28.8
지역활성과	10				10	10			21.0
환경녹지과	8				8	8			9.5
해양수산과	9	2		2	7	7			41.1
도시건축과	2	1	1		1	1			55.0
건설교통과	11				11	6	5		27.3
보건소	2				2	2			37.5
농축산과	6	1	1		5	5			37.2
농촌활력과	2				2	2			10.0
농업기술과	1				1	1			10.0
체육시설사업소	4				4	4			7.5

II 부서별 공약사업 목록


구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
기획예산담당관	감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	이행후 계속추진
	정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	일부추진 (10)
	예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	일부추진 (5)
관광진흥담당관	관광개발팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	정상(30)
	관광개발팀	II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	정상(5)
	관광개발팀	II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	정상(5)
	관광마케팅팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	정상(20)
	관광축제팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	정상(10)
	관광마케팅팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	정상(10)
	관광마케팅팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	정상(20)
행정과	통신관제팀	III-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	정상(10)
	행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	정상(70)
	정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축'비포서비스'구현	정상(20)
	군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	정상(80)
	통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	완료
주민복지과	노인복지팀	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	정상(10)
	여성보육팀	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	정상(20)
	여성보육팀	V-15-89	청조회 폐지	완료

구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율%
재무과	경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	일부추진 (0)
	세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	이행후 계속추진
	재산관리팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	정상(10)
	재산관리팀	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	일부추진 (0)
문화청소년과	문화예술팀	II-4-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	일부추진 (10)
	문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	일부추진 (10)
	문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	정상(10)
	문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	정상(25)
	문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	일부추진 (10)
	문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	정상(10)
	문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	정상(20)
	드림아동팀	IV-7-69	초등학생 종일돌봄 확대	정상(18)
	교육청소년팀	IV-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	정상(10)
	교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	정상(80)
	교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	정상(90)
	교육청소년팀	V-12-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	정상(70)
	평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	정상(30)
	평생학습팀	V-14-88	경남독서학교 남해유치	정상(10)
지역활성 과	투자유치팀	I -1-1	친환경 제조업 남해 유치	정상(10)
	투자유치팀	I -2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정상(20)
	투자유치팀	I -3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	정상(10)
	지역경제팀 투자유치팀	I -5-5	복적복적 남해읍 전통시장 만들기	정상 (25/45)
	지역경제팀	I -6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	정상(50)

구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
지역 활성 과	지역경제팀	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	정상(40)
	투자유치팀	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	정상(20)
	친환경 에너지팀	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	정상(10)
	친환경 에너지팀	Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	정상(5)
	친환경 에너지팀	IV-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	정상(10)
환경 녹지 과	산림조성팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(5)
	공원관리팀	Ⅱ-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	정상(10)
	공원관리팀	Ⅱ-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	정상(10)
	산림조성팀	Ⅱ-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	정상(10)
	환경지도팀	Ⅲ-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	정상(21)
	산림조성팀	Ⅲ-13-57	연죽~현촌간 임도개설	정상(5)
	산림조성팀	Ⅲ-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐 링의숲 조성	정상(5)
	환경정책팀	Ⅲ-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐 조시설 설치	정상(10)
	환경정책팀	IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	정상(5)
해양 수산 과	해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	이행후 계속추진
	연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	정상(10)
	수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	정상(30)
	연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	정상(50)
	해양보전팀	I-22-22	양식장 수질저질 정화를 통한 생산량 증대	이행후 계속추진
	양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	정상(10)
	양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	정상(10)
	양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	정상(30)
	연안관리팀	Ⅱ-5-30	상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간'	정상(30)

구분	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율%
도시 건축 과	복합민원팀	Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	완료
	경관디자인팀	Ⅲ-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	정상(10)
건설 교통 과	교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	정상(50)
	도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	정상(50)
	교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	정상(20)
	도로팀	Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일부추진 (10)
	교통지도팀	Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	정상(10)
	도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	일부추진 (10)
	도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선확포장공사조기추진 건의	일부추진 (0)
	도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	일부추진 (10)
	교통지도팀	IV-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	정상(40)
	교통지도팀	IV-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	정상(90)
	보건 소	치매예방팀	IV-1-63	생활터 치매 행복마을 조성
건강생활팀		IV-9-71	임산부 고충 경감	정상(50)
농축 산과	유통지원팀	I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(10)
	귀농기획팀	I -11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	정상(60)
	농업정책팀	I -13-13	가격안정기금 조성 (농축산물 가격안정기금 조성)	정상(30)
			가격안정기금 조성 (농업인 월급제 추진)	정상(30)
	유통지원팀	I -14-14	특산물판매장 건립	완료
	축산정책팀	I -16-16	축산종합지원센터 운영	정상(30)
	가축방역팀	I -21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	정상(5)
농촌 활력 과	농촌자원팀	I -15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	정상(10)
	농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	정상(10)

구분	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
농업 기술 과	원예작물팀	I -10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	정상(10)
	마늘팀	I -12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	정상(10)
	원예작물팀	I -13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	정상(10)
체육 시설 사업 소	레포트팀	Ⅱ-2-27	드론 교육훈련센터 운영	정상(10)
	체육시설팀	Ⅱ-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(10)
	체육시설팀	Ⅲ-18-62	파크골프장 조성	정상(10)
	체육시설팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립	정상(0)

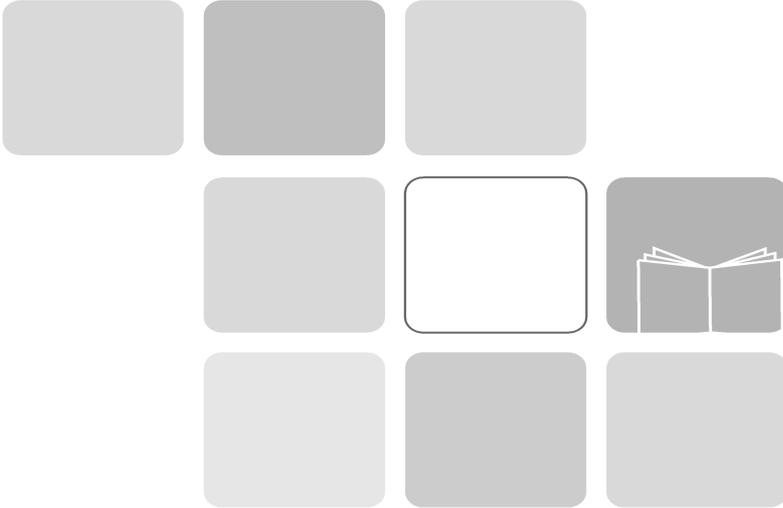

기획예산담당관

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[기획예산담당관]

1. 총 평

- 깨끗한 남해군청을 만들기 위한 각종 시책을 추진하였으나 2018년 공공기관 청렴도 평가에서 4등급에 머무름. 평가기간이 2018년 7월부터인 2019년 공공기관 청렴도 평가에서 우수한 성적을 받기 위한 시책 추진
- 상반기 행정혁신위원회 설치를 위하여 조례안 작성 등 제반 사항을 추진 중. 제반사항이 완비되면 상반기 중으로 행정혁신위원회 설치 가능할 것으로 판단
- 예산절감 추진을 위한 재정진단 용역의 예산을 당해연도 확보하여 상반기 중으로 재정진단 용역 실시 예정

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3		1			2		

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
기획 예산 담당 관 (전수)	감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	정상
	정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	일부추진 (10%)
	예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	일부추진 (5%)

나. 세부내용

이행후 계속추진

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	없음	매년 말

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	없음	10%
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시)	없음	5%

관리번호	V-01-75														
공약명	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100
주관 부서	기획예산담당관		담당팀		감사팀		담당자		박경화		전화번호		860-3054		

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 공무원 클린센터 운영 내실화
 - 청렴교육 및 자율적 내부통제 활성화
 - 주민감사 청구제도 홍보
 - 소속 공무원의 직무관련 범죄행위에 단호히 대처
- 사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	110	0	22	22	22	22	22	0
국비	0							
도비	0							
군비	110		22	22	22	22	22	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 7월 : 청렴도 향상을 위한 『청렴순회방문』 실시
- 2018년 8월 : 공직자 청렴교육 실시
- 2018년 8월 : 공용차량 관련 공직자 청렴교육 실시
- 2018년 8월 : 청렴동아리 워크숍 실시
- 2018년 12월 : 하반기 공직자 청렴교육 실시
- 2018년 12월 : 청렴 실천 우수부서 선정 및 포상
- 2018년 7월 ~ 12월 : 홈페이지 부조리, 불편신고사항 55건 처리
- 2018년 7월 ~ 12월 : 청백-e시스템 사전 진단 발생 250건 처리

■ 향후계획

- 올 초 수립하여 전 부서에 통보한 『2019년 기관 청렴도 향상 대책』의 내실 있는 추진
 - 청렴 및 부패에 대한 인식 전환을 위한 청렴교육 실시
 - 취약분야 부패·부조리 예방
 - 공무원 행동강령 등 청렴 관계 제도 개선
- 내부통제 강화를 통한 부정위험 저감
 - 홈페이지 내 클린신고(내부고발) 운영 활성화
 - 국민권익위원회 부패방지종합정보시스템 도입
 - 청백-e시스템 운영으로 비리발생 및 행정오류 사전차단
- 외부통제기능 활성화
 - 주민감사 청구제도 운영 홍보 강화
 - 명예감사관 역량 강화를 위한 적임자 물색 및 위촉
- 비위 행위자 엄단
 - 뇌물수수, 횡령 등 직무범죄 발생 시 사법당국에 고발조치
 - 고질적·관행적 비리 예방을 위한 감찰 활동 강화

■ 문제점 및 대책

- 해당없음

관리번호	V-2-76														
공약명	남해군 행정혁신위원회 설치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10%
주관 부서	기획예산담당관		담당팀		정책기획팀		담당자		안선영		전화번호		860-3033		

■ 사업개요

- 근거
 - 행정효율과 협업촉진에 관한 규정(대통령령)
 - 국가균형발전특별법 및 동법 시행령
- 기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 남해군 행정혁신위원회 설치 운영
- 사업비 : 18백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	18	0	0	2	2	2	2	10
국비	0							
도비								
군비	18			2	2	2	2	10
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 조례안 작성 중

■ 향후계획

- 2019년 2월 ~ 3월 : 자치법규 제정
- 2019년 4월 ~ : 행정혁신위원회 구성 및 운영

■ 문제점 및 대책

- 없음

관리번호	V-4-78														
공약명	알뜰살뜰 예산절감 추진 [예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시]														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	기획예산담당관		담당팀		예산팀		담당자	신미옥	전화번호		860-3063				

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 재정진단 용역 1식
- 사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	100			100				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2019. 1. : 재정진단용역 원가계산 실시

■ 향후계획

- 재정진단 용역 발주 및 착수 : 2019. 2.
- 재정진단 용역 완료 : 2019. 8.

■ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

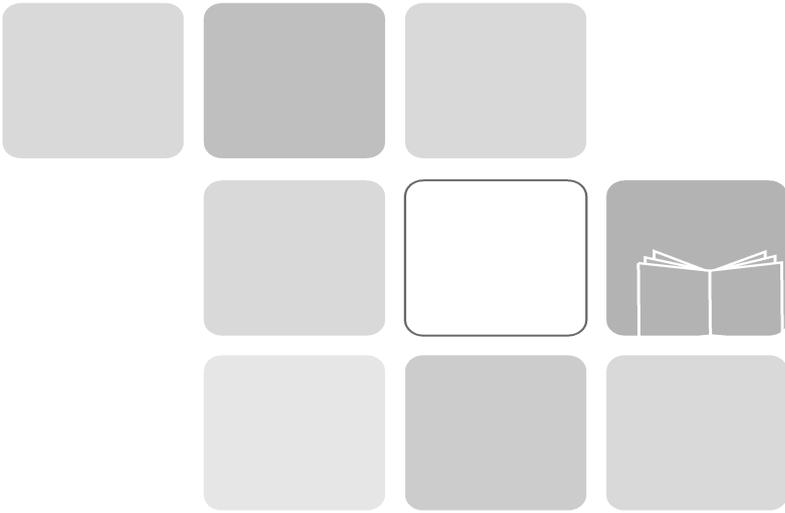

관광진흥담당관

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[관광진흥담당관]

1. 총 평

- 대규모 사업비가 투자되는 사업은 관련 협의를 완료하여 지속 추진
- 소규모 사업 등은 연초 정상

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
7			7	7			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
관광 진흥 담당과 (7건수)	관광개발팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	정상 (30)
	관광개발팀	II-1-26	프랑스 ‘어린왕자’ 테마파크 남해공원 유치	정상 (5)
	관광개발팀	II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	정상 (5)
	관광마케팅팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	정상 (20)
	관광축제팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	정상 (10)
	관광마케팅팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	정상 (10)
	관광마케팅팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	정상 (20)

나. 세부내용

□ 추진중(정상) : 7건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	없음	30%
II-1-26	프랑스 ‘어린왕자’ 테마파크 남해공원 유치	없음	5%
II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	없음	5%
II-6-31	남해관광개발공사 설립	없음	20%
II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	없음	10%
II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	없음	10%
II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	없음	20%

관리번호	I-4-4														
공약명	항노화산업 육성 기반 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광개발팀		담당자	김선미	전화번호		860-8614				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 웰니스관광 프로그램 개발 및 항노화바이오
산업체 유치기반 조성
- 사 업 비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200	0	0	48	8	30	20	94
국비	18				4			14
도비	33							33
군비	149			48	4	30	20	47
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 2019년 해양항노화 신규사업 제출(경상남도)
- 해양항노화 소재 생물자원 DB 구축
- 2018년 10월 : 경남 시군 항노화산업 담당자 실무회의 참석
- 2018년 11월 : 항노화산업조성 추진을 위한 업무협약의
(경남항노화주식회사)
- 2018년 12월 : 남해군 해양웰니스자원조사 용역 실시

■ 향후계획

- 문화체육관광부 웰니스관광 클러스터 사업 공모신청 : 2019년(2019. 2.)
- 웰니스관광 프로그램 개발 용역 : 2019년(2019. 5.)
- 해양자원 활용 향노화 바이오 기술 및 제품개발 지원
 - 기술개발 및 마케팅 지원(남해마늘연구소) : 2019년(2019. 7.)
- 다이어트 센터, 힐링센터 내 향노화 웰니스 향노화 프로그램 시범 운영 : 2020년(2020. 10.)

■ 문제점 및 대책

- 해당없음

관리번호	II-1-26														
공약명	프랑스 '어린왕자 테마파크' 남해공원 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
		○			○		○			○					
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광개발팀		담당자		박문두		전화번호		860-8613		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용 : 테마관 조성(항공탐험, 수중탐험, 동·식물 등),
각 주제 행성별 3D 어드벤처 영화관, 오락기구 등
- 사 업 비 : 20,100백만원(시군비 100, 민자 20,000)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후	
계	20,100	-	-	-	20	-	80	5,000	15,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	100	-	-	-	20	-	80	-	-
민자등	20,000	-	-	-	-	-	-	5,000	15,000

■ 향후계획

- '19. 2월 ~ 5월 : 타당성조사 용역
- '19. 8월 ~ '20. 12월 : 민간투자 유치활동 전개
- '21. 2월 ~ 12월 : 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 수립
용역 및 행정절차 이행
- '22. 2월 ~ '23. 12월 : 공사 착수 및 준공 운영

■ 문제점 및 대책

- 경기침체에 따른 민간투자 유치 애로
⇒ 적극적인 투자유치 활동을 통해 빠른 시일 내 민간사업자 선정

관리번호	II-3-28														
공약명	미조 순환 관광 로드 개발														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○		○						5
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광개발팀		담당자	박문두	전화번호	860-8613					

■ 사업개요

- 위 치 : 미조면 미조리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업내용 : 모노레일(송정~망산), 케이블카(망산~조도), 부대시설
(매표소, 관리실, 판매점, 주차장, 광장, 조경시설 등)
- 사 업 비 : 62,600백만원
(국비 5,000, 도비 1,500, 군비 7,100, 기타 49,000)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	62,600	-	20	50	1,530	3,000	4,000	54,000
국비	5,000	-	-	-	-	500	2,000	2,500
도비	1,500	-	-	-	-	150	600	750
군비	7,100	-	20	50	1,530	2,350	1,400	1,750
민자등	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000

■ 추진상황(실적)

- '18. 10월 : 기본계획 및 타당성조사용역

■ 향후계획

- '19. 4월 : 타당성조사 의뢰서 제출(행정안전부)
- '19. 10월 : 타당성조사 완료 및 투자심사위원회 검토
- '19. 12월 : 타당성조사 결과 통보(행정안전부→남해군)
- '20. 3월 : 군관리계획(지구단위계획 및 군계획시설) 결정 용역 착수
- '21. 2월 : 실시설계용역 착수
- '22. 2월 : 공사 착수
- '25. 12월 : 준공 및 운영

■ 문제점 및 대책

- 인근 지자체(사천시, 여수시 등) 케이블카 운영 및 신규 사업 추진(하동군)으로 과잉투자 우려
- ⇒ 기획 단계부터 인근 관광자원과 연계된 차별화된 관광 개발로 2차, 3차 파생 관광거점으로 조성

관리번호	II-06-31														
공약명	남해 관광개발공사 설립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광마케팅팀		담당자		홍보영		전화번호		860-8602		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업내용
 - 수익형 관광자원개발 프로젝트 기획 추진
 - 공사 설립 및 미래형 관광자원개발사업 발굴 추진
- 사 업 비 : 61,120백만원
(국비 3,500, 도비 2,000, 군비 25,620, 민자 등 30,000)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	61,120	0	20	100	5,000	6,000	50,000	0
국비	3,500				1,500	2,000		
도비	2,000				1,000	1,000		
군비	25,620		20	100	2,500	3,000	20,000	
민자등	30,000						30,000	

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 남해군관광개발공사 설립 방향 모색연구 용역 계약
- 2019년 1월 : 남해군관광개발공사~용역 착수 (2019.1.3.~2019.4.2.)
- 2019년 1월 11일 : 남해군 관광발전을 위한 관련 세미나 개최

■ 향후계획

- 관광자원개발 프로젝트 확정 및 추진 기본계획 수립 : 2019년
- 중기재정계획 및 재정투융자심사 등 재정계획 반영 : 2020년
- 정부, 경남도 관광개발공사 설립 협의 : 2020년
- 관광개발공사 설립 타당성 연구용역 시행 : 2020년

■ 문제점 및 대책 : 예산확보 필요

관리번호	II-08-33														
공약명	문화관광축제 경쟁력 강화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광축제팀		담당자	고희식	전화번호		860-8593				

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
 - 민간주최 축제지원 기획단 조직 운영 : 민간 + 행정
 - 축제 사전심사 및 사후평가 강화 : 남해군축제관리위원회
 - 민간이전 시행 확대
- 사업비 : 7,664백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	7,664	0	1,149	1,315	1,300	1,300	1,300	1,300
국비	0							
도비	45		45					
군비	7,619		1,104	1,315	1,300	1,300	1,300	1300
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 관광진흥담당관 관광축제팀 신설

■ 향후계획

- 민간주최 축제지원 기획단 조직 : 2019년
- 축제 사전심사 및 사후평가 : 2019년 ~ (분기별 1회)
- 축제 주관 민간 이전 추진 : 2019년 ~

■ 문제점 및 대책

- 축제 추진단체의 역량 부족 및 소규모축제 증가로 인해 예산 낭비 지적 초래
 - ⇒ 객관적 평가를 통한 인센티브(또는 패널티) 적용으로 축제 경쟁력 강화

관리번호	Ⅱ-11-36														
공약명	고현·설천·남해 역사관광코스개발														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광마케팅팀		담당자	윤성찬	전화번호		860-8604				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 권역관광 투어버스 시범운영 및 역사코스 정비
- 사업비 : 100백만원 (국35, 도10.5 군54.5) (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국비	35			35				
도비	10.5			10.5				
군비	54.5			54.5				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 자료수집 중

■ 향후계획

- 투어버스 시범운영
 - 운영코스 : 남해·노랑대교 - 충렬사거북선 - 이순신순국공원 - 유배문학관
 - 시행방안 : 여행전문사업자 용역 시행(모객-투어-인센티브)
- 역사관광코스 용역 및 시설정비

■ 문제점 및 대책

- 관광상품 구성 미흡 → 단기 실행 가능 프로그램 우선 착수
- 테마관광 요소 부족 → 역사관광코스 정비

관리번호	Ⅱ-19-44														
공약명	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	관광진흥담당관		담당팀		관광가메팅팀		담당자	정나경	전화번호		860-8605				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 (매년 반복)
- 사업내용 : 문화관광해설사 활동비 인상 및 근무환경 개선
- 사업비 : 1,905백만원(국비199, 도비207, 군비1,499)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,905	0	310	319	319	319	319	319
국비	199		29	34	34	34	34	34
도비	207		32	35	35	35	35	35
군비	1,499		249	250	250	250	250	250
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2018년 12월 : 2019년 예산반영 : 교통비, 투어비

■ 향후계획

- 교통비, 투어비 등 월별 지급
- 문화관광해설사 근무여건 개선 및 역량강화 실시

■ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

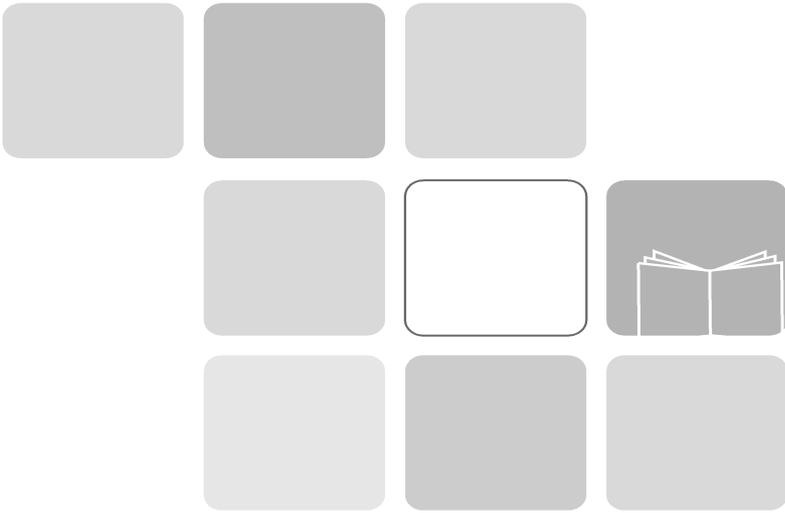

행정과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[행정과]

1. 총 평

- 능력과 전문성 위주의 발탁인사와 투명하고 공정한 공무원 인사 추진으로 소외된 곳 없이 공감하고 소통하는 인사를 시행함
- '군민소통위원회 운영' 및 '이장·새마을지도자들의 처우개선'을 통해 군민의 종합적인 소통의 장을 마련하고 행정과의 유대를 강화함
- 과학적 데이터 기반의 정책수립을 위한 '빅데이터 구축'과 관광객들의 편의증대를 위한 '무선인터넷망 확충'이 계획에 따라 정상 진행중임
- 군수실 CCTV 설치를 완료함으로써 군정 업무의 투명성을 확보하고 군민에게 신뢰받는 행정기반을 조성함

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
6	1	1	4	4	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
행정과 (6)	통신관제팀	Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	정상(10)
	행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	정상(70)
	군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	정상(80)
	정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축 '비포서비스' 구현	정상(20)
	통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	완료

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
V-16-90	군수실 CCTV 설치	2018.11.30.

이행후 계속추진

관리번호	제 목	완료연월일
V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	2019.1.4.

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
III-15-59	공공 무선인터넷 확충 및 WiFi서비스	없음	10%
V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	없음	70%
v-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	없음	80%
V-6-80	빅데이터 구축 ‘비포서비스’ 구현	없음	20%

관리번호	Ⅲ-15-59														
공약명	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	행정과		담당팀		통신관제팀		담당자		신주익		전화번호		860-8813		

■ 사업개요

- 위치 : 관광지, 공원 등 공공장소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 무선인터넷 시설(무선AP, 네트워크 장비, 통신망) 설치
- 사업비 : 173백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	173	0	0	53	58	62	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	173			53	58	62		
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 2019년 공공 무선인터넷 사업 예산 확보
- 2018년 12월 : 사업대상지(마을회관 등) 선정 전수조사 실시

■ 향후계획

- 185마을 마을회관 및 경로당 내 무선인터넷 설치 : 2월중
- 2019년 공공 무선인터넷 사업(7개소) 추진 : 2월~3월
- 하반기 사업대상지 전수조사 및 사업비 확보 : 4월~5월
- 공공 무선인터넷 확대를 위해 국·도비 신청 : 국·도 사업 지원 시

관리번호	V-3-77														
공약명	투명하고 공정한 공무원 인사														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100
주관부서	행정과		담당팀		행정팀		담당자		강홍주		전화번호		860-3113		

■ 사업개요

- 대상 : 전 공무원
- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 내용 : 능력과 전문성 중심의 투명하고 공정한 공무원 인사

■ 추진상황

- 과감한 발탁인사 추진 : 연중 실시
 - 정기인사 실시(2회) 및 현안업무 책임자 수시 인사 반영
- 소외된 곳 없이 챙기는 인사 : 연중 실시
 - 소수직렬 승진·전보(40건) 및 균형 인사 반영 조직 개편 실시
- 희망보직 및 인사고충 반영 : 정기, 수시 인사시 반영
 - 정기인사를 통한 희망보직 및 인사고충 접수 : 30건
 - 수시 고충 상담을 통한 적재적소 인력 재배치 : 10건

■ 향후계획

- 공적이 있는 공무원이 우대받을 수 있는 인센티브 제도 운영
- 업무 공정성 향상 및 능동적 조직문화를 위한 팀장고유직무제 추진

■ 문제점 및 대책

- 인사 후 보완의견 수렴을 통한 활력있는 직장분위기 조성

관리번호	V-5-79														
공약명	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				70

주관 부서	행정과	담당팀	군민소통팀	담당자	최월륜	전화번호	860-3143
----------	-----	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 군민소통위원회 개요

- 구 성 : 100명 이내(5개 분과 20명 이내)
- 임 기 : 2년
- 기 능
 - 지역현안이나 주요 쟁점사항 등에 대한 해결방안 제시
 - 군민 생활불편 및 제도개선 등에 대한 건의사항 제안
 - 군정 발전과 주민 화합을 위해 필요한 사항 등
- 사 업 비 : 229백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	229	0	15	34	60	60	60	0
국비	0							
도비	0							
군비	229		15	34	60	60	60	
민자등	0							

■ 추진상황

- 2018년 7월 : 군민소통위원회 구성 추진계획 수립 및 공고
- 2018년 9월 : 남해군 군민소통위원회 설치 및 운영등에 관한 조례 제정
- 2018년 9월 : 역량강화 교육 실시 및 군민소통팀 신설
- 2018년 10월 : 분과위원회 개최(5회) 및 임원 선출
- 2018년 11월 : 위촉식 및 워크숍 개최
- 2018년 12월 : 분과위원회 개최 2회

■ 향후계획

- 정기회 개최 : 연 2회(6월, 12월)
- 분과위원회 회의 개최 : 연 4회 이상(분기별)
 - 임시회 : 필요시 수시개최
 - 분야별 현안에 대한 분과위원회 개최
- 소통위 임원진 회의 : 연 4회(분기별)
- 역량강화 교육 실시 : 연 3회(3월·6월·9월)
- 우수지자체 견학 실시 : 연 1회(5월)
- 소통위 워크숍 실시 : 연 1회(12월)

■ 기대효과

- 다양한 의견수렴으로 숙의민주주의 정착
- 군민이 원하는 사업 발굴과 갈등 조정이 용이

관리번호	V-7-81														
공약명	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				80
주관 부서	행정과		담당팀		군민소통팀		담당자		최월륜	전화번호		860-3143			
									신대호			860-3144			

■ 사업개요

- 대 상 : 800여명(이장 222명, 새마을지도자 580명)
- 사업기간 : 계속 지원사업
- 사업내용 : 남해군 이장단·새마을지도자들의 처우개선 및 사기진작을 위한 각종 사업 추진 및 지원
- 사업비 : 3,163백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,163	0	613	630	635	640	645	0
국비	0							
도비	60		12	12	12	12	12	
군비	3,103		601	618	623	628	633	
민자등	0							

■ 추진상황

- 2018년 이장자녀 장학금 지원 : 고등 2명 / 1,881천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 고등 3명, 대학 1명 / 4,284천원
- 새마을의 날 기념식 및 화합한마음 지원 : 4월, 8,505천원
- 2018년 남해군 모범이장 국외연수 실시 : 6월 / 19백만원
- 새마을해외협력사업 지원 : 6월, 14,250천원(캄보디아 화장실 신축 등)
- 2018년 남해군 이장역량강화 워크숍 실시 : 7월, 2,356천원
- 2018년 남해군 모범이장 국내연수 실시 : 8월, 6백만원
- 남해군 이장자녀 장학금 지원조례 개정 : 8월, 지원대상 확대(대학생)

- 이장 단체상해 공제 갱신(70백만원), 보험금 지급(52명/22,711천원)
- 퇴임이장단장 및 모범이장 표창 수여 : 모범이장 12명, 퇴임단장 4명
- 제9회 이장·새마을지도자 화합한마음 대회 : 11월, 30백만원
- 새마을활력화 평가 우수읍면 시상 : 10개읍면, 20백만원

■ 향후계획

- 퇴임이장 및 퇴임지도자 감사패 등 수여 : 2월중
- 이장자녀 장학금 지급 : 2~3월중
 - 지급대상 확대(고등학생→대학생)
- 새마을자녀 장학금 지급 : 2~3월중
- 새마을의 날 기념식 : 4월중
- 모범이장 이장 국·내외 연수 지원 : 6~8월중
- 이장역량강화 워크숍, 모범이장 해외연수 추진 : 6월중
- 모범이장 국내연수 및 새마을운동해외협력사업 추진 : 7월중
- 제10회 이장·새마을지도자 화합한마음대회 : 11월중
- 남해군 모범이장 표창 : 12월중

■ 기대효과

- 이장·새마을지도자 처우개선을 통한 사기진작 및 행정과의 유대 강화
- 이장·지도자의 복리증진 및 소통강화로 원활한 가교역할 지원

관리번호	V-6-80														
공약명	빅데이터 구축 '비포서비스' 구현														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	행정과		담당팀		정보전산팀		담당자		이기성		전화번호		860-3133		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 군정 현안 · 공약사업, 대민서비스 빅데이터 분석
- 사업비 : 222백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	222	0	0	122	100	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	222			122	100			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8~ 10월 : 전자민원창구 빅데이터 분석 활용 활성화(11건)
- 2018년 10~11월 : CCTV 설치현황 등 2건 빅데이터 분석
- 2018년 11~12월 : 빅데이터 기획 · 분석 우수기관 견학

■ 향후계획

- CCTV 빅데이터 분석 활용 활성화 : 2019.1월~2월
- 빅데이터 분석 과제발굴 용역 시행 : 2019.1월~3월
- 2019년 남해군 빅데이터 분석(2~3건) : 2019. 5월 ~ 12월

관리번호	V-16-90														
공약명	군수실 CCTV 설치														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100
주관부서	행정과		담당팀		통신관제팀		담당자	신주의	전화번호		860-8813				

■ 사업개요

- 위 치 : 군수실 내부, 복도
- 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2018년 11월
- 사업내용 : CCTV 2대, 저장장치 1대
- 사 업 비 : 5백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5	0	5	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	5		5					
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 행정절차(행정예고, 보안성 검토 등) 이행
- 2018년 11월 : CCTV 공사 발주, 설치, 성능시험
- 2018년 12월 : 비서실 사용자 교육 및 CCTV 운영 개시

■ 향후계획

- CCTV 화각, 녹화 현황, 정상 작동 유무 매월 점검 실시

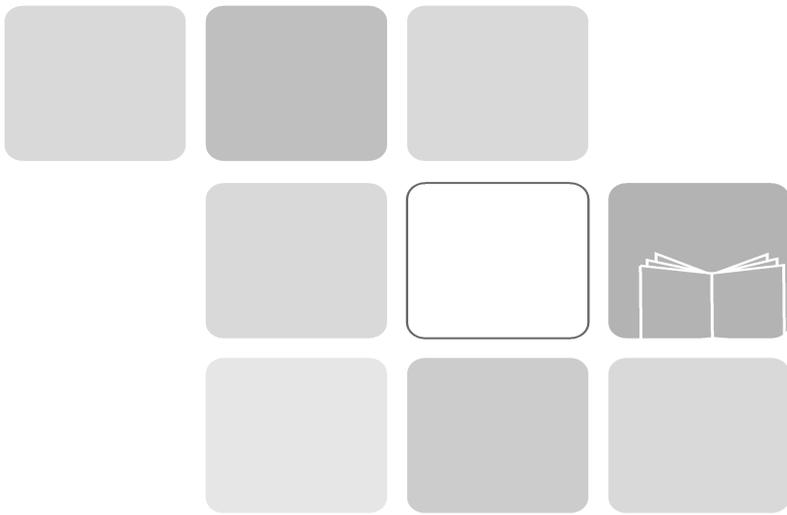

주민복지과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[주민복지과]

1. 총 평

- 어르신의 행복한 환경을 만들기 위한 'WHO 고령친화도시 지정' 사업과 군민의 육아부담을 경감하기 위한 '아이 키울 걱정 없는 남해' 사업은 정상 중이며,
- '청조회 폐지' 사업은 18. 9월 단기적으로 완료하여 지역 내 부정적인 요인해소와 회원 간 자율적인 봉사활동을 유도하였음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3	1	-	2	2	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
주민 복지 과 (3)	주민복지과	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	정상(10)
	주민복지과	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	정상(20)
	주민복지과	V-15-89	청조회 폐지	완료

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
V-15-89	청조회 폐지	2018. 9.

□ 추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	없음	10%
IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	없음	20%

관리번호	IV-5-67														
공약명	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	주민복지과		담당팀		노인복지팀		담당자		류수정		전화번호		860-3833		

■ 사업개요

- 사업명 : WHO 고령친화도시 가입
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 전략과제 발굴, 주민 의견수렴, 조례제정, 실행계획 수립
- 사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	0	200	1,000	1,000	800	0
국비	1,400	0	0	0	500	500	400	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,600	0	0	200	500	500	400	0
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 자료조사, 부서별 의견수렴 및 분야별 T/F팀 구성 : '18. 10월 ~ 11월
- WHO 고령친화도시 가입을 위한 세부계획 수립 : '18. 12월

■ 향후계획

- T/F팀 회의개최 : '19. 2월
- 고령친화도시 조례 제정 : '19. 3월
- 고령친화도시 인증 추진전략 연구 용역 : '19. 3월 ~
- 고령친화도시 3개년 실행계획서 수립 : '19. 7월 ~
- 고령친화도시 가입 신청 : '20. 6월

관리번호	IV-6-68														
공약명	아이 키울 걱정 없는 남해														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	주민복지과		담당팀		여성보육팀		담당자		정운경		전화번호		860-3849		

■ 사업개요

- 어린이집 : 13개소(국공립 2, 법인의 5, 민간 5, 가정 1)
- 아동수 : 정원 738명(현원 644명, 입소율 87.26%)
- 보육교직원 : 147명(원장 13명, 담임교사 92명, 기타 42명)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 어린이집 토지매입신축 1개소, 기능보강, 운영지원, 처우개선 등
- 사업비 : 6,105백만원(국비 1,417, 도비 708, 군비 3,980)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	6,105	0	277	1,469	3,034	677	648	0
국비	1,417	0	131	375	616	155	140	0
도비	708	0	64.5	187.5	308.5	77.5	70	0
군비	3,965	0	81.5	906.5	2,094.5	444.5	438	0
민자등	15	0	0	0	15	0	0	0

■ 추진상황(실적)

- 국공립 남해어린이집 토지매입 및 신축
 - 2018년 10월 : 투자심사 및 공유재산심의회 등 사전절차 이행
- 어린이집 보육환경 및 보육의 품질 개선 추진
 - 2018년 1월~12월 : 공공형 및 평가인증 참여 어린이집 환경개선비
 - 2018년 12월 : 어린이집 환경개선 기능보강(공기청정기 보급 및 잠자는 아이 확인장치 설치 완료)
- 2018년 1월~12월 : 외래진료실 운영 및 입원실 설치남해병원 소아청소년과

■ 향후계획

- 국공립 남해어린이집 토지매입 및 신축
 - 하나금융그룹 민관협력 국공립 어린이집 자원사업(최대 12억) 신청: 2019년(2019. 1. ~ 2019. 6.)
 - 어린이집 이전 신축 부지 매입(군비) : 2019년 (2019. 2. ~)
 - 군립 남해어린이집 신축 사업 국도비(최대 6억 9천) 신청 : 2019년 (2019. 6.)
 - 국도비지원 사업 확정, 건립위원회 구성 : 2019년 (2019. 9. ~)
 - 기본 및 실시 설계 실시, 보건복지부 기본 설계 지문 의뢰 및 심의 반영: 2019년(2019. 2 ~ 11)
 - 착공 및 준공 예정 : 2020년 (2020. 1. ~ 12.)
- 민간어린이집 국공립 전환(장기임차) ※ 국고 연계: 국공립 어린이집 이용률 40% 추진
 - 국공립 전환 계획 및 공고 : 2019년 (2019. 1. ~ 2.)
 - 보육정책위원회 심사 : 2019년 (2019. 3. ~ 4.)
 - 시도 보육정책위원회 심사 : 2019년 (2019. 5.)
 - 보건복지부 주관 국공립 장기임차 심의위원회 심의 : 2019년 (2019. 6.)
 - 국도비(리모델링비, 기자재비, 근저당설장비 최대 220백만원) 지원: 2019년 (2019. 7.)
 - 장기임차 계약(최소 5년 ~ 최대 10년) 및 근저당설정 : 2019년 (2019. 8. ~)
- 어린이집 보육환경 및 보육의 품질 개선 추진
 - 어린이집 환경개선 기능보장 : 2019년 ~ 2022년
 - 3~5세 누리과정 보육료 추가 지원(9개소) : 2019년 ~ 2022년
 - 어린이집 공기청정기 보급(13개소) : 2020년
 - 영유아 급식비 지원(13개소) : : 2021년 ~ 2022년
 - 차량운영비 및 구입비 지원(13개소) : : 2019년 ~ 2022년
- 보육교직원 처우개선
 - 어린이집 대체교사 추가 인건비 지원 : 2019년 ~ 2022년
 - 보육교직원 명절설·추석 및 스승의 날 특별수당 추가 지원 : 2020년 ~ 2022년
- 소아청소년과 설치 운영 지원(남해병원) : 2018년 ~ 2022년
 - 외래진료실 운영 및 입원실 설치 : 4실 7명(1인실 3실, 4인실 1실)
 - 소아청소년과 전문의 1명, 간호사 4명

■ 문제점 및 대책

- 군립 남해어린이집의 시설 균열, 누수 등 건물 노후화가 급속히 진행되어 영유아의 안전문제 대두
 - ➔ 2019년 국공립 기능보강 사업(국도비)으로 3천만원 지원 계획, 토지매입·착공을 조속히 진행될 수 있도록 검토 중.

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계	2018	2019	2020	2021	2022 이후		
계	국도	6,105	277	1,469	3,004	677	648		
	도	1,417	131	375	616	155	140		
	군	708	64.5	187.5	308.5	77.5	70		
	소계	3,980	81.5	906.5	2,109.5	444.5	438		
주 민 복 지 실	남해어린이집신축 (보조사업) <신규사업>	소계	3,080		580	2,500			
		국도	461			461			
	도	231			231				
	군	2,388		580	1,808				
	기능보강	기능보강 계	소계	784	27	519	109	79	50
			국도	331		250	30	30	15
			도	165		125	15	15	8
		군	289		144	64	34	28	
		민간어린이집 국공립 전환 기능보강 (보조사업) <신규사업>	소계	440		440			
	국도	220		220					
	도	110		110					
	군	110		110					
	국공립등 기능보강 (7개소) <기존사업>	소계	210		60	60	60	30	
		국도	105		30	30	30	15	
	도	52.5		15	15	15	7.5		
	군	52.5		15	15	15	7.5		
	어린이집 환경개선(공기청정기 등) <신규사업>	소계	40	10					
		국도	6	6					
	도	2	2						
	군	32	2			30			
공공형 및 평가인증 참여어린이집 환경개선	군	94	17	19	19	19	20		
	어린이집운영지원 계	868		108	138	311	311		
어린이집운영지원	누리과정보육료 <신규사업>	336		84	84	84	84		
	운영지원(급식비) <신규사업>	390		11	11	184	184		
	운영지원(차량운영비) <기존사업>	52		13	13	13	13		
	운영지원(차량구입비) <신규사업>	90			30	30	30		
	보육교직원 처우개선 계	123		12	37	37	37		
보육교직원처우개선	보육교직원처우개선 (대체교사수당추가지원) <기존사업>	48		12	12	12	12		
	보육교직원처우개선 (명절 및 승의날 특별수당) <신규사업>	75			25	25	25		
보건소	영유아 의료시설 지원 (보조사업)	소계	1,250	250	250	250	250	250	
		국도	625	125	125	125	125	125	
		도	312.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	
		군	312.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	

관리번호	V-15-89														
공약명	청조회 폐지														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			100
주관 부서	주민복지과		담당팀		여성보육팀		담당자		전정현		전화번호		860-3848		

■ 사업개요


- 사업명 : 청조회 폐지
- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 9월
- 사업내용 : 남해군청 내 5급 이상 공무원 부인 및 5급 이상 여성 공무원으로 구성된 청조회를 폐지하여 지역 내 부정적인 요인 해소와 회원 간의 자율적인 봉사활동 유도
- 사업비 : 비예산

■ 추진상황(실적)

- 청조회 자체 회의개최로 폐지 결정 : 2018. 7. 23
- 여성단체협의회 3분기 정기회의시 정관에 따라 탈회 건을 안건으로 상정하여 가결함 : 2018. 9. 13
- 공약사항 완료 : 2019. 9월

■ 향후계획

- 해당없음

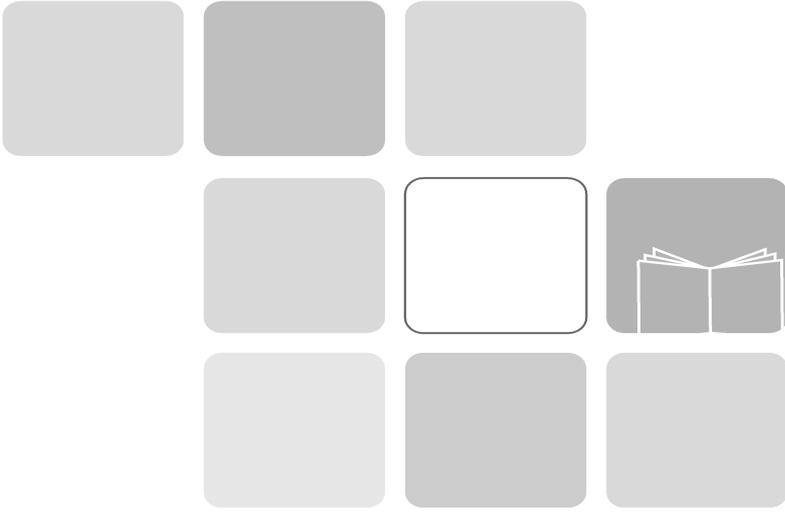

재 무 과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[재 무 과]

1. 총 평

- 강력한 체납처분을 통한 자주재원 확충 및 성실납세자가 우대받는 납세 풍토 조성
- 숙의민주주의를 통한 군청사 이전 및 행정타운 조성
- 민원 불편해소와 도시재생을 위하여 청사부지를 활용한 문화공간 조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3		0.5	2	1	1	0.5	

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
재 무 과 (3건)	경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	일부추진 (0)
	세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진	이행후 계속추진
	재산관리팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	정상 (10)
	재산관리팀	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	일부추진 (0)

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진(체납실태조사반 운영)	2018.12.31

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	없음	10%

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	청사이전 계획과 함께 사업 추진 대상	0%
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공사원가 공개 및 표준시장 단가 적용)	건설공사 원가 공개를 기시행하고 있는 타 시도에서 건설협회와 분쟁이 있어 추후 결과를 확인 후 진행하며 우리군의 경우 필요시 정보공개청구 안내하겠음	

관리번호	V-4-78														
공약명	알뜰살뜰 예산절감 추진														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○			○				0
주관 부서	재무과		담당팀		경리팀		담당자	권홍엽	전화번호		860-3163				

■ 사업개요

- 건설공사 원가 공개 : 10억 이상 군 홈페이지(공공발주공사)
- 공사비 산정단가 표준시장단가 적용 법률 검토
 - 근거법령 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)
 - 적용범위 : 100억 이상 표준시장단가, 100억 이하 표준품셈
 - ※ 표준품셈 : 표준품셈에서 제공하는 세부 공정별 단위 수량에 단가를 곱하여 산정
 - ※ 표준시장단가 : 표준품셈 등(표준시장 단가 포함)을 적용하여 완료된 공사에서 형성된 시장거래가격을 기초로 산출한 단가 적용(표준품셈 및 시장단가 관리규정-국토부 훈령)

■ 추진상황(실적)

- 건설공사 원가 공개 검토
 - 시행시기 : 2019년(잠정)
 - 공개범위 : 10억 이상 건설공사의 설계내역서, 도급내역서, 하도급내역서, 설계변경내역서 등
 - 공개방법 : 군 홈페이지 게시(공사계약 공개와 별도 운영)
- 표준시장단가 적용
 - 적용범위 : 100억 이상 공사시 표준시장단가 우선 적용 원칙

■ 향후계획

- 표준시장단가 적용대상(100억이상)에 대한 관련 규정 개정시 추진
 - 현재 경기도청 건의로 시군 의견 접수중

■ 문제점 및 대책

- 건설공사 원가 공개를 기 시행하고 있는 타 시·도에서 건설협회와 분쟁이 있어 추후 결과를 확인 후 진행하며 필요시 정보공개청구 안내하겠음

관리번호	V-4-78														
공약명	알뜰살뜰 예산절감 추진(채납실태조사반 운영)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100

주관 부서	재무과	담당팀	세입관리팀	담당자	여지현	전화번호	860-3183
----------	-----	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

○ 채납현황(2018.12.31)

(금액 : 백만원)

구분	부과액		징수액		채납액		징수율(%)	
	현년도	과년도	현년도	과년도	현년도	과년도	현년도	과년도
합계	45,652	1,660	45,123	629	529	1,031	99	37
지방세	34,934	691	34,554	312	380	379	99	45
세외수입	10,718	969	10,569	317	149	652	98	32

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 지방세 채납실태조사반 구성·운영
 - 구성 : 읍면별 2조, 12명(세입관리팀 2명, 읍면담당자 10명)
재무과장 총괄, 세입관리팀장 전담 반장
 - 내용 : 채납자 방문, 징수독려 및 생계형 채납자 선별
30만원 미만 소액채납 중점 징수
- 2018년 12월 : 채납징수기동반 운영
 - 관내외 1백만원 이상 채납자 Man to Man 독려
- 2018년 11월, 12월 : 세외수입 징수대책보고회 개최(부군수 주재)

■ 향후계획

- 세외수입 채납실태조사반 부서별 구성·운영
- 신규 채납의 신속한 채납사유 파악 및 납부 독려
- 고액채납자 신속한 채권확보 : 부동산·예금 압류 및 공매 실시

관리번호	V-8-82														
공약명	군청사 이전 및 행정타운 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	재무과		담당팀		재산관리팀		담당자		류인수		전화번호		860-3153		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 부지매입 : 100억원
 - 건물신축 : 500억원(본관동, 의회동 등 14,000m²)
 - 신청사 및 기존청사 정비 : 25억원
 - 행정·복합타운 조성 : 유관기관, 금융기관 등 입주
- 사 업 비 : 62,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	62,500	0	0	9,700	10,000	10,000	10,000	22,800
국비	0							
도비	0							
군비	62,500			9,700	10,000	10,000	10,000	22,800
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 청사부지 의회 협의

■ 향후계획

- 2019년 1월 : 군민소통위원회, 군민과의 대화를 통한 의견수렴
- 2019년 2월 : 「청사추진위원회」 발족, 대상지 1차 선정
- 2019년 3월 : 1차 선정 대상지에 대한 전문가 지문 및 주민공청회 실시
- 2019년 3월 : 청사신축 대상지 선정, 도시계획시설(공공청사) 확정
- 2019년 4월 : 청사신축 기본구상용역 발주, 대상지 보상
- 2019년 9월 : 행정안전부 타당성 검토
- 2020년 5월 : 경상남도 투자심사
- 2020년 7월 : 공유재산관리계획 승인
- 2020년 8월 : 착공
- 2022년 12월 : 준공

관리번호	V-09-83														
공약명	청사 이전에 따른 문화공간 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○								
주관 부서	재무과		담당팀		재산관리		담당자		류인수		전화번호		860-3153		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1번지 일원
- 사업기간 : 2022년 이후
- 사업내용
 - 다목적 문화공간 조성
: 문화공원, 야외공연장, 휴게공간, 생태주차장 등
 - 관광자원화 : 남해읍성 복원, 느티나무 복원
- 사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
국비	0							
도비	0							
군비	10,000							10,000
민자등	0							

■ 추진상황

- 현재 추진사항 없음

■ 향후계획

- 청사이전 계획과 함께 사업 추진

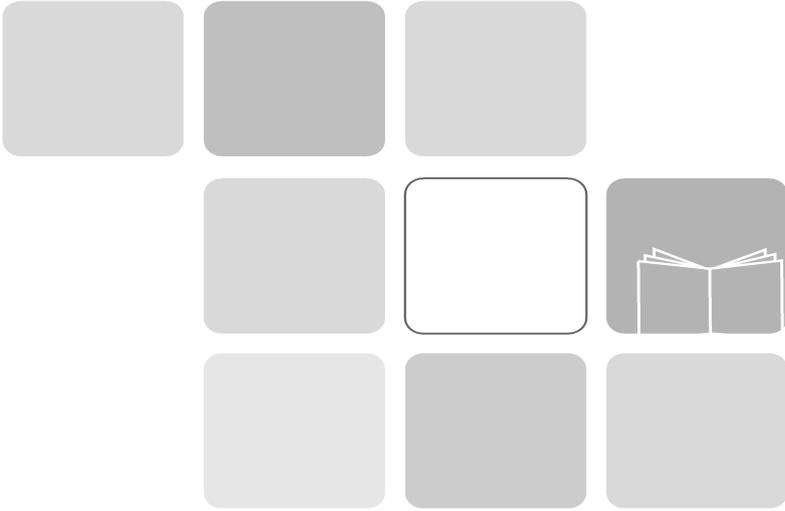

문화청소년과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[문화청소년과]

1. 총 평

- 문화청소년과 소관 공약사항은 14건으로 문화예술, 청소년, 문화재 분야에서 문화예술회관 건립 130억, 청소년 수련시설 건립 137억, 고려 대장경 판각지 성역화 사업 120억 등 사업비가 많이 소요되며, 국도비가 반영되어야 하는 사업이 많음
- 국도비 반영 사업의 추진율이 높지 않으나, 타당성 조사 및 투자심사 등 국도비 확보를 위한 사전 단계를 잘 추진하고 있어 원활한 공약사업 추진이 가능 할 것으로 판단됨.
- 문화예술단체 지원, 아동 종일돌봄, 창의적인 인재육성, 무상교복 지원, 경남독서 학교 유치 등 아동부터 어르신까지 문화와 교육, 문화재와 청소년 등 모든 연령과 분야를 아우르는 공약의 성공적인 추진으로 행복한 보물섬을 만드는 초석을 다지겠음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
14	0	0	14	11	3	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
문화 청소년과 (14건)	문화예술팀	II-04-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	일부추진 (10%)
	문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	일부추진 (10%)
	문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	정상 (10%)
	문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	정상 (25%)
	문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	일부추진 (10%)
	문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	정상 (10%)
	문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	정상 (20%)
	드림아동팀	IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	정상 (18%)
	교육청소년팀	IV-08-70	남해군 청소년 수련시설 건립	정상 (10%)
	교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	정상 (80%)
	교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	정상 (90%)
	교육청소년팀	V-12-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	정상 (70%)
	평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	정상 (30%)
	평생학습팀	V-14-88	경남독서학교 남해유치	정상 (10%)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II -10-37	남해 문화예술회관 건립	해당없음	10%
II -13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	해당없음	25%
II -16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	해당없음	10%
II -18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	해당없음	20%
IV -07-69	초등학생 종일돌봄 확대	해당없음	18%
IV -08-70	남해군 청소년 수련시설 건립	해당없음	10%
V -10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	해당없음	80%
V -11-85	중고등학생 무상교복 지원	해당없음	90%
V -12-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	해당없음	70%
V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	해당없음	30%
V-14-88	경남 독서학교 남해유치	해당없음	10%

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II -04-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	대도시의 K-Pop페스티벌 개최로 타당성 조사 필요	10%
II -10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	사업대상지 변경으로 인한 보완용역 실시	10%
II -14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	공원계획변경 협의	10%

관리번호	II-04-29														
공약명	남해 K-Pop 체험랜드 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○		○						10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화예술팀		담당자		최진호		전화번호		860-8624		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원(장소미정)
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용 : K-Pop 체험랜드 조성
- 사 업 비 : 11,300백만원(국비 5,600, 도비 1,680, 군비 4,020)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	11,300	0	0	0	50	0	1,000	10,250
국비	5,600						500	5,100
도비	1,680						150	1,530
군비	4,020				50		350	3,620
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 군비 예산안(50백만원) 미반영

■ 향후계획

- 2019년 6월 : 국내 K-Pop 체험랜드 현장조사
- 2019년 9월 : K-Pop 체험랜드 자문의견 수렴 (K-Pop 방향)

■ 문제점 및 대책

- 국내 대도시(서울, 부산, 창원)의 매년 K-Pop페스티벌 개최로 관광객 유치의 어려움 예상
- 우리나라 제주도 플레이 K-Pop(75억 투자) 2015년 개장이후 관광객 감소

관리번호	II-10-35														
공약명	고려대장경 판각지 성역화 사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		여창현		전화번호		860-8635		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 고현면 포상리 208번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 기록문화관(1,000m²), 역사경관공원, 발굴체험장
- 사 업 비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,000	0	0	0	1,200	4,800	3,000	3,000
국비	6,000				600	2400	1500	1500
도비	1,800				180	720	450	450
군비	4,200				420	1680	1050	1050
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2014년 5월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- 2015년 8월 : 고려대장경 판각지 문화재 발굴조사 완료
- 2017년 3월 : 고려대장경 판각지 경상남도 문화재 지정(2건)
- 2018년 10월 : 경상남도 지방재정계획심의(재검토)

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 기본계획수립 및 타당성 보완용역
- 2019년 10월 : 제3차 경상남도 지방재정계획심의 의뢰

■ 문제점 및 대책

- 사업대상지 변경으로 인한 보완용역 실시

관리번호	II-12-27														
공약명	남해 문화예술회관 건립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	문화청소과		담당팀		문화예술팀		담당자		최진호		전화번호		860-8624		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 남해대로 2745 남해유배문학관 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 조성면적 A=3,013m²
 - 전문공연장 414석, 다목적실(소공연장) 108석, 야외공연장 100석, 전시홀 등
- 사 업 비 : 13,000백만원(국비 2,000, 군비 11,000)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	13,000	0	(40)	(30)	500	12,500	0	0
국 비	2,000				250	1750		
도 비	0							
군 비	11,000		(40)	(30)	250	10,750		
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11월 ~ 2019년 2월 : 문예회관 건립 기본구상 및 타당성 조사
- 2018년 12월 : 문예회관 건립 적정성 검토 의뢰
- 2019년 1월 : 경남도 투자심사 의뢰

■ 향후계획

- 2019년 3월 : 경남도 투자심사
- 2019년 4월 : (투자심사 가결 시) 2020군특회계 도자율편성 사업 신청
- 2020년 2월 : 공사 착공
- 2021년 10월 : 준공
- 2021년 12월 : 개관준비

관리번호	II-13-38														
공약명	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				25
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화예술팀		담당자		장서윤		전화번호		860-8623		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 선소로 12, 남해문화원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 문화창달의 주역인 남해문화원에 대한 합리적 수준의 지원을 통한 군민의 삶의 질 향상 및 자긍심 고취
- 사업비 : 799백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	799	0	99	166	168	178	188	0
국비	0							
도비	38		6	8	8	8	8	
군비	761		93	158	160	170	180	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 : 문화학교 운영 등 100백만원 지원
- 2019년 1월 ~ 12월 : 문화학교 운영 등 165백만원 지원

■ 향후계획

- 매년 남해문화원 운영, 사업비 보조를 위한 사전 수요조사 및 예산 편성
- 보조사업 신청에 따른 보조금 교부 및 집행 지도
- 사업비 집행 정산 검사 철저

관리번호	II-14-39														
공약명	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		박효선		전화번호		860-8636		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 상주면 양아리 93 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 서복전시관(1,000m²), 주차장
- 사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,500	0	0	500	300	4,700	0	0
국비	2,500				150	2350		
도비	750				45	705		
군비	2,250			500	105	1645		
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 해당없음

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 기본계획수립 및 타당성용역 및 부지보상(추경 확보)
- 2019년 5~12월 : 부지보상 및 타당성용역

■ 문제점 및 대책

- 공원계획변경 및 공원사업시행 허가 협의

관리번호	II-16-41														
공약명	남해문화유적지 학술조사 용역														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		여창현		전화번호		860-8635		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 소재 문화유적지
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용
 - 서면 서호리 삼별초 학몽유적지 복원
 - 남해군 천도교와 동학혁명 성지화
- 사 업 비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	40	0	0	40	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	40			40				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 해당없음

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 서면 서호리 삼별초 학몽유적지 복원 학술용역
- 2019년 2월 : 남해군 천도교와 동학혁명 성지화 학술용역

관리번호	II-18-43														
공약명	남해 선비 유배길 조성 및 남해향교 활성화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	문화청소년과		담당팀		문화재팀		담당자		박효선		전화번호		860-8636		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해향교, 유배문학관, 노도 일원
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용
 - 남해향교 충효교실 운영, 전통문화계승사업(유림의 날 행사)
 - 향교서원 문화재 활용사업
- 사 업 비 : 104백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	104	0	0	22	82	0	0	0
국비	30				30			
도비	13.2			6.6	6.6			
군비	60.8			15.4	45.4			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 해당없음

■ 향후계획

- 2019년 2월 ~ 11월 : 남해향교 충효교실 운영
- 2019년 6월 : 향교서원 문화재 활용사업 공모 신청
 - 남해향교→유배문학관→노도 문학의 섬 등 유배길 정비와 탐방
- 2019년 10월 ~ 12월 : 남해향교 전통문화계승사업

관리번호	IV-07-69														
공약명	초등학생 돌봄 확대														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○		○				○				○				18
주관부서	문화청소년과		담당팀		드림아동팀		담당자		이현룡		전화번호		860-8648		

■ 사업개요

- 사업대상 : 돌봄이 필요한 모든 초등학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 지역아동센터(7개소) 운영, 다함께 돌봄센터 설치(1개소)
- 사업비 : 3,658백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,658	0	559	617	676	626	590	590
국비	1,677		257	281	310	285	272	272
도비	796		123	133	145	135	130	130
군비	1,185		179	203	221	206	188	188
민자등	0		0	0	0	0	0	0

■ 추진상황(실적)

- 2018년 : 지역아동센터(7개소) 운영에 따른 운영지원
- 2018년 12월 : 초등학교 재학생 돌봄 수요조사

■ 향후계획

- 2019년 1월 ~ : 지역아동센터 운영지원 내실화 :
 - 특성화 프로그램 운영 지원 : 7개소
 - 환경개선비 지원 : 2개소
- 다함께 돌봄센터 설치
 - 2019. 1월 : 초등학교 신입생 돌봄 수요조사 실시
 - 2019. 5월 ~ 6월 : 다함께 돌봄 설치 가능시설(유휴공간) 조사
 - 2019. 7월 : 다함께 돌봄사업 시행 신청
 - 2020. 3월 ~ : 다함께 돌봄센터 운영

관리번호	IV-08-70														
공약명	남해군 청소년 수련시설 건립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○		○		○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 위치 : 남해읍 소재(청소년 접근이 용이한 장소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 규모 : 부지 3,563㎡, 건축연면적 4,613㎡
- 사업비 : 13,750백만원(국비 9,610, 군비 4,140)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	13,750	0	50	2,100	450	5,575	5,575	
국비	9,610				360	4625	4625	
도비	0							
군비	4,140		50	2,100	90	950	950	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 01월 : 학부모네트워크 간담회시 청소년 수련시설 요구(지방선거 후보자)
- 2018년 07월 : 남해청소년수련관 사업계획 수립(군수공약사업)
- 2018년 09월 : 부지매입 관련 협의(남해교육지원청)
- 2018년 11월 : 공유재산 관리계획 반영
- 2018년 12월 : 중기지방재정계획 반영
- 2019년 01월 : 경상남도(여성가족정책관) 업무 협의 (시행계획 및 신청협의)
- 2019년 01월 : 지방재정 투자심사 의뢰

■ 향후계획

- 2019년 01월 : 부지매입
- 2019년 02월 : 남해군 청소년수련관 건립 사업 신청
- 2019년 09월 ~ 12월 : 국비지원사업 확정 건립위원회 구성 수요자 요구조사
- 2020년 02월 : 기본설계 실시, 여성가족부 기본설계 지문의뢰 및 심의반영
- 2020년 05월 ~ 2021년 05월 : 공사착공 및 준공

관리번호	V-10-84														
공약명	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				80
주관 부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 초중고 학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴
- 사 업 비 : 4,980백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,980	0	830	830	830	830	830	830
국비	0							
도비	0							
군비	4,980		830	830	830	830	830	830
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 3월 ~ 12월 : 지역사회의 협력을 통한 행복교육도시 구축
 - 진로체험프로그램 지원 : 진로특강, 진로체험, 학습캠프 등
 - 동아리 지원, 토요일마을 학교, 바다학교 등 운영
- 2018년 01월 ~ 12월 : 학력 향상 프로그램 운영
 - 초등학생 영어캠프 운영 : 경남도립대학 위탁
 - 중고생 외국어 프로그램 운영 : 향토장학회 해외연수 사업 추진
 - 우수교원 지원 프로그램 발굴 : 해외연수기회 제공 및 연구비지원
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강
 - 학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대, 화전학당 운영

■ 향후계획

- 2019년 3월 ~ 12월 : 행복교육지구 운영
 - 2018년 : 학부모, 학교, 학생의 지원 수요조사
 - 2019년 : 수요자 중심의 맞춤형 지원
 - 토요마을학교, 꿈빛자유학교, 바다마을학교 등 운영
- 2019년 3월 ~ 12월 : 단계별 학력 향상 프로그램 운영
 - 초등학생 영어캠프 운영(7월) : 경남도립대학 위탁
 - 중2, 3 대상 영어 경시대회 개최(3월) : 영어 경시대회 개최를 통해 입상자 해외연수 인센티브
 - 중고생 외국어 향상 예산 증액 : 향토장학회 해외연수 사업 연계 및 확대
 - 우수교원 지원 프로그램 발굴(2월~7월) : 해외연수기회 제공 및 연구비지원
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대
 - 방학 중 남해 출신 대학생 강사 초청으로 방과 후 학교 운영

관리번호	V-11-85														
공약명	중·고등학생 무상교복 지원														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				90
주관부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 대상 : 관내 중·고등학교 신입생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 교복구입비 지원
- 사업비 : 880백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	880	0	0	176	176	176	176	176
국비	0							
도비	0							
군비	880			176	176	176	176	176
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 교복지원 사업 추진계획 및 조례제정 계획 수립
- 2018년 9월 : 교복 지원 사업 조례 입법예고
- 2018년 9월 : 교복 지원 사업 사회보장제도 협의(보건복지부)
- 2018년 11월 : 교복 지원 사업 조례제정
- 2018년 11월 : 교복 지원 사업 사회보장제도 완료(보건복지부)

■ 향후계획

- 2019년 1월 ~ 2월 : 사업 홍보
- 2019년 3월 ~ 7월 : 사업 신청 접수
- 2019년 3월 ~ 7월 : 교복구입비 지급

관리번호	V-11-86														
공약명	남해군과 남해대학의 협력강화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				70
주관 부서	문화청소년과		담당팀		교육청소년팀		담당자		안성필		전화번호		860-8643		

■ 사업개요

- 대상 : 독립남해대학
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 프로그램 운영 지원 및 발전협의회 운영, 특성화 명문대학 육성
- 사업비 : 3,580백만원(균비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,580	0	1,490	1,050	260	260	260	260
국비	0							
도비	0							
균비	3,580		1,490	1,050	260	260	260	260
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 특성화명문대학으로 육성 지원 : 2018년 9월 ~
 - 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(13억원)
 - 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(1.9억원)

■ 향후계획

- 2019년 3월 : 지역민과 함께 하는 평생교육 프로그램 운영
 - 평생교육원 프로그램 강화, 귀농·귀어·귀촌 정착교육 연계 협력(농어업회의소)
- 2019년 3월 : 경남도립남해대학발전협의회 운영 활성화
 - 기존 운영 중인 발전협의회 정례화 협의(남해대학)
- 2019년 2월 : 특성화명문대학으로 육성
 - 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(5억원)
 - 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(5.5억원)

관리번호	V-13-87														
공약명	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	문화청소년과		담당팀		평생학습팀		담당자		박옥자		전화번호		860-3863		

■ 사업개요

- 위 치 : 화전도서관 및 작은도서관 등
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 독서동아리 등록 및 활동 지원
- 사 업 비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	110	0	10	25	25	25	25	0
국비	0				0			
도비	0							
군비	110		10	25	25	25	25	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 9월 ~ 12월 : 독서동아리 등록 접수 및 도서 지원
- 한울타리 외 7개 등록, 회원수 69명, 모임 24회, 토론도서 118권 지원
- 2019년 1월 ~ 12월 : 독서동아리 수시 등록

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 독서동아리 대표자 간담회
- 2019년 4월 : 문학기행 또는 문학관 견학
- 2019년 5월 : 유명저자 특강 개최
- 2019년 9월 : 독서동아리 연합토론대회
- 2019년 12월 : 독서동아리 활동집 발간

관리번호	V-14-88														
공약명	경남독서학교 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	문화청소년과		담당팀		평생학습팀		담당자		박옥자		전화번호		860-3863		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1122번길 22 물건중학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 폐교(물건중)를 활용한 (가)서부경남독서학교 설립
※ 경남교육청의 계획수립 → 예산확보 → 리모델링 → 개교(2020년)
- 사 업 비 : 276백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	276	0	36	60	60	60	60	0
국비	0				0			
도비	0							
군비	276		36	60	60	60	60	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11월 : 남해교육장 방문, 사업제안서 제출
⇒ 물건마을 주민의 동의가 필요
- 2018년 11월 : 물건마을주민과 간담회, 사업 설명
⇒ 공공의 사용과 마을에 도움이 되는 사업에 찬성
- 2019년 01월 : 경남도교육감 방문, 사업제안서 제출
⇒ 기존 건물을 리모델링하여 활용하는 방안 검토

■ 향후 계획

- 2019년 2월 : 경남교육청의 물건중학교 활용 계획 확정에 따라 사업추진을 위한 업무협약 또는 다른 장소 검토

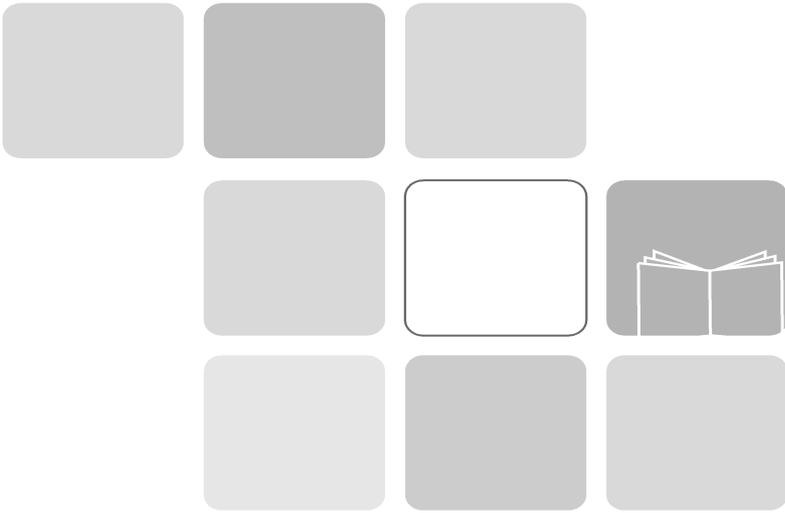

지역활성과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[지역활성과]

1. 총 평

- 건강한 지역경제 기반마련하기 위한 남해화폐 발행
- 신재생에너지 보급에 따른 에너지 복지 증진
- 산업도시 도약을 위한 기업투자유치 환경 조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
10	0	0	10	10	0	0	

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
지역 활성과 (10건)	투자유치팀	1-1-1	친환경 제조업 남해 유치	10%
	투자유치팀	1-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	20%
	투자유치팀	1-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	10%
	지역경제팀 투자유치팀	1-5-5	북적북적 남해읍 전통시장 만들기	25%/45%
	지역경제팀	1-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	50%
	지역경제팀	1-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	40%
	투자유치팀	1-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	20%
	친환경 에너지팀	1-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	10%

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
	친환경 에너지팀	Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	5%
	친환경 에너지팀	Ⅳ-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	10%

나. 세부내용

□ 추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	없음	10
I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	없음	20
I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	- 도 주관 규제자유특구 사업 신청	10
I-5-5	북적북적 남해읍 전통시장 만들기	- 해수공급장치에 대한 시장상인들의 인식개선 제고	25/45
I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	없음	50
I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	없음	40
I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	없음	20
I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	- 태양광발전사업에 대한 농지의 일시사용허가 농지법 미개정 - 개발행위허가 시 짐족이 변경되어 난개발 및 부동산 투기 우려 - 농지의 경우 태양광 패널 하부 농작물 경작시 일시사용 허가 시범 적용	10
Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	- 주민불편 및 안정사고 우려 - 주민에게 사업홍보 및 부서별 공사공정 협업	5
Ⅳ-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	- 공사비 과다, 전력생산량 미미 - 사업규모 축소	10

관리번호	I -1-1														
공약명	친환경 제조업 남해 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	지역활성과		담당팀		투자유치팀		담당자		서명재		전화번호		860-3229		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 읍면별 생활밀착형 제조업 육성, 공공 제조시설 활용 주민창업 활동 지원
- 사업비 : 12,930백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,930	0	0	30	900	1,000	1,000	10,000
국비	1,870				270	300	300	1000
도비	397				67	90	90	150
군비	5,503			30	203	210	210	4850
민자등	5,160				360	400	400	4000

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 읍면별 생활밀착형 제조업 육성방안 수립 용역 준비

■ 향후계획

- 타당성 및 기본계획 수립 용역 시행
 - 시행시기 : '19년 1분기
 - 내용 : 경쟁력 있는 생활밀착형 업종의 발굴·육성 방안, 주민 직접생산품의 원스톱 상품화를 통한 쉬운 창업 활성화 방안, 기존 면단위 제조업의 업그레이드 및 온라인 유통 혁신 방안 등

관리번호	I -2-2														
공약명	서면지구 신재생에너지 산업 유치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
		○				○		○			○				20
주관 부서	지역활성과		담당팀		투자유치팀		담당자		김은진		전화번호		860-3228		

■ 사업개요

- 위치 : 서면 중현리 일원 (면적 : 660,000㎡)
 - 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
 - 사업내용 : IGCC 발전소 중심의 신재생에너지 산단조성(3,000MW급)
- (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	6,000,000	0	1,200	18,400	36,400	73,000	140,000	5,731,000
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자등	6,000,000		1,200	18,400	36,400	73,000	140,000	5,731,000

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : IGCC 건설 타당성 용역 완료
- 2018년 12월 : 전기사업인허가 신청서류 준비 완료

■ 향후계획

- 2019년 상반기 : 발전사업 인허가 신청
- 2022년 5월 : IGCC 발전소 착공
- 2026년 10월 : IGCC 발전소 준공

관리번호	I -3-3														
공약명	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	지역활성과	담당팀	투자유치팀		담당자	김은진	전화번호	860-3228							

■ 사업개요

- 위치 : 창선면 당저리 일원 (면적 : 186,989㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용 : 비행차 운항 테스트베드 및 관련 인프라 조성
- 사업비 : 100,630백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100,630	0	0	30	200	200	200	100,000
국비	25,000							25,000
도비	10,000							10,000
군비	15,630			30	200	200	200	15,000
민자등	50,000							50,000

■ 추진상황(실적)

- 타당성 및 기본계획 수립 용역 시행
 - 시행시기 : '18년 12월
 - 내용 : 비행차 기술동향, 비행차의 법제화 방향, 부지조성 방안, 공역 등 운항인프라 적합성 검토, 경남도 중장기 항공산업 육성계획과의 연계 방안, 관련산업의 발굴 및 단지 활용방안 등
- 경상남도 주관 규제자유특구 사업 신청 : '18. 10월

■ 향후계획

- 당저지구 공유수면의 국가 귀속화 조기 추진 : '18 ~ '19년
 - 내용 : 75필지 186,989㎡(해양수산과·경남도 ↔ 해양수산부)
- 규제자유특구 지정 반영 추진 : 2019년중
- 토지활용의 규제 해소 추진 : '19 ~ '21년
 - 공유수면 매립기본계획 반영, 수자원보호구역 해제 등
- 비행차 운항 테스트베드 단지 조성 추진 : 2022년 ~

관리번호	I-5-5														
공약명	복적복적 '남해읍 전통시장' 만들기 [전통시장 뒷길 "청년문화거리" 조성]														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				25
주관부서	지역활성과		담당팀		도시재생팀		담당자		박은비		전화번호		860-3239		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 터미널~유림사거리, 하나로마트~해양초교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 시장 뒷길 시설정비 및 상권활성화 프로그램 구축
- 사 업 비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,000	0	0	200	200	200	400	0
국비	600			120	120	120	240	
도비	120			24	24	24	48	
군비	280			56	56	56	112	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 4월 : 도시재생 전략 및 활성화계획 수립용역 착수
- 2018년 9월 : 도시재생사업 최종 선정 통보
- 2018년 12월 : 남해읍 관광형도시 활성화계획 수립(실타포함) 용역 착수
- 2018년 12월 : 도시재생 선도지역 지정 고시(국토교통부고시 제2018-857호)

■ 향후계획

- 2019년 1월 : 활성화계획 승인 신청
- 2019년 1월 : 공유재산심의, 군의회 의견청취, 토지보상협의
- 2019년 4월 : 활성화 계획 승인 및 고시
- 2019년 6월 : 사업착공

관리번호	I -5-5
------	--------

사업구분	복적복적 '남해읍 전통시장' 만들기 (남해경제살리기 남해읍 전통시장 현대화 사업)														
	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○			○	○		○				○				45

주관부서	지역활성과	담당팀	지역경제팀	담당자	강은비	전화번호	860-3194
------	-------	-----	-------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 화전로 110 남해전통시장
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 전통시장 시설현대화사업, 남해읍 시장축제 개최
- 사 업 비 : 606백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'23년이후
계	606	0	93	103	200	210	0
국비	332		38	54	120	120	
도비	20			10		10	
군비	212		55	37	60	60	
민자등	42			2	20	20	

■ 추진상황(실적)

- 2018년 4월 : 방화셔터 구축 실시설계 용역 의뢰
- 2018년 7월 : 방화셔터 및 전기공사 실시
- 2019년 1월 : 전통시장 옥상 CCTV 3대 설치 의뢰

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 전통시장 옥상 CCTV 3대 설치 완료
- 2019년 2월 : 해수공급장치 설계 용역 의뢰
- 2019년 3월 : 해수공급장치 공사 실시

관리번호	I -6-6														
공약명	남해화폐 화전(花錢) 확대 보급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50
주관 부서	지역활성과		담당팀		지역경제팀		담당자		김희진		전화번호		860-3193		

■ 사업개요

- 위치(대상) : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업내용 : 남해화폐(지류·전자) 확대 발행·보급, 남해화폐 위탁·대행(농협), 남해화폐 확대발행 홍보 실시 등
- 사업비 : 980백만원

■ 추진상황(실적)

- 남해화폐 플랫폼 구축을 위한 남해군과 KT간의 MOU 체결 : '18. 11. 8.
- 「남해군 남해화폐 발행 및 관리에 관한 조례」 제정 : '18. 12. 17.
- 남해화폐 화전(花錢) 명칭 확정 : '18. 12. 13.
- 남해화폐 발행에 따른 설명회 실시(관련부서 및 읍면) : '18. 12. 13.
- 남해화폐 활성 간담회 실시(관내 전 금융기관) : '19. 1. 9.

■ 향후계획

- 남해화폐 화전(花錢) 발행 설명회 실시(관내 기관·단체) : '19. 1. 23.
- 남해화폐 화전(花錢) 발행 기념 행사 개최 : '19. 1. 31.
- 남해화폐 화전(花錢) 사용 활성화 추진 : 연중
 - 맞춤형 복지제도 특별포인트 남해화폐 화전(花錢) 지급 협의
 - 전입세대 지원금 남해화폐 화전(花錢) 지급 추진
 - 유료관광지 입장료 남해화폐 화전(花錢) 환급 홍보
- 전자식 남해화폐(QR결제) 추진 : '19 상반기 시범 실시

관리번호	I -7-7														
공약명	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				40
주관 부서	지역활성과		담당팀		지역경제팀		담당자		한유정		전화번호		860-3195		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 관내 기존 협동조합(7개소), 잠재적 신규 협동조합
- 사업내용
 - 협동조합 유형 개발 및 유형별 홍보
 - 신규 협동조합 설립에 대한 교육 및 컨설팅
 - 협동조합 협의회 구성을 통한 기존 협동조합 연계 강화
 - 기성 협동조합에 대한 사업 및 활동 지원
- 사 업 비 : 200백만원(연간 5천만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200	0	0	50	50	50	50	0
국비	0							
도비	0							
군비	200			50	50	50	50	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 전국 협동조합 설립 사례 조사 및 전파 : 2018년 9월
- 「남해군 사회적 경제 육성 및 지원에 관한 조례」 제정 : 2018년 11월
- 남해군 사회적 경제기업 및 소상공인 간담회 개최 : 2018년 12월

향후계획

- 협동조합 지원을 위한 간담회 개최 : 2019. 1. 22. (화)
- 협동조합 육성 지원 사업 시행 : 2019. 4월
- 전국 협동조합 워크숍, 포럼 개최 : 2019. 7월

관리번호	I -8-8													
공약명	중소기업의 경쟁력 확보 지원													
사업구분	임기구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	완료후 계속추진	이행률(%)
	○				○		○				○			20
주관부서	지역활성과	담당팀	투자유치팀	담당자	서명재	전화번호	860-3229							

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 대 상 : 군내 중소기업
- 사업내용 : 금융지원 확대, 유통혁신 지원, 남해대학 배출인력의 지역 내 취업 지원 등
- 사업비 : 1,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,720	0	280	240	300	300	300	300
국비	0							
도비	0							
군비	1,720		280	240	300	300	300	300
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 중소기업육성자금 융자 및 이차보전 지원
 - 융자지원 : 1개 업체 2억원, 5개 업체 10백만원 이차보전
- 지식재산권 창출 지원사업 시행(50백만원)
 - 특허권, 브랜드·디자인 개발, 융복합제품 개발, 전문컨설팅 등

■ 향후계획

- 중소기업육성기금 융자지원 운영 : 융자규모 10억원 내외/년
- 중소기업육성기금 상환기간 연장 : 상환기간을 3년에서 5년으로 연장하여 기업지원 강화(이자차액 보전기간은 3년)
- 지식재산 창출사업 확대 : 남해마늘연구소와 협업 추진

관리번호	I -9-9
------	--------

공약명	태양광 이모작 농지발전소 시범조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10

주관 부서	지역활성과	담당팀	친환경에너지팀	담당자	지호진	전화번호	860-3218
----------	-------	-----	---------	-----	-----	------	----------

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2019년
- 사업내용 : 1MW(100kw미만 × 10개소, 읍면당 1개소)
- 사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	100			100				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 추진계획수립

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 대상마을 선정
- 2019년 3월 : 시공계약 및 인허가, 보조금 지원신청
- 2019년 6월 : 준공 및 보조금교부 정산

■ 문제점 및 대책

- 태양광발전사업에 대한 농지의 일시사용허가 농지법 미 개정
 - 개발행위허가 시 지목이 변경되어 난개발 및 부동산 투기 우려
- 농지의 경우 태양광 패널 하부 농작물 경작시 일시사용허가 시범 적용

관리번호	Ⅲ-1-45														
공약명	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	지역활성과		담당팀		친환경에너지팀		담당자		김영근		전화번호		860-3217		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : LPG저장시설 50톤*2기, 배관 55km, 가스보일러 등
- 사 업 비 : 33,123백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	33,123	0	0	12,806	20,317	0	0	0
국 비	16,562			6183	10379			
도 비	3,312			1324	1988			
군 비	9,937			3975	5962			
민자등	3,312			1324	1988			

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 설계사 선정 및 실시설계용역 계약

■ 향후계획

- 2019년 6월 : 설계 적정성 평가(조달청)
- 2019년 9월 : 공사착공
- 2020년 12월 : 공사준공 및 연료공급

■ 문제점 및 대책

- 대규모 공사* 가 동시 다발적 시행으로 주민불편 및 안전사고 우려
 - 주민에게 사업홍보 및 부서별 공사공정 협업 시행

* 도시재생, 상수도 노후관로 현대화사업, 권역단위 거점개발 사업

관리번호	IV-3-65														
공약명	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	지역활성과		담당팀		친환경에너지팀		담당자		김영근		전화번호		860-3217		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 노인복지회관(예정)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2019년
- 사업내용 : 전기생산 보도블럭 설치 25EA
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	60	0	0	60	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			60				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2019년 1월 : 설계내역서 작성

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 사업착공
- 2019년 5월 : 사업준공

■ 문제점 및 대책

- 전기생산 보도블럭은 공사비가 과다하게 소요되는 반면 전력생산량 (0.3W/회)이 극히 미미하고 특정인(75세 어르신)에 대한 전기 보도블럭 간 인식시스템 구축 불가
 - 사업규모 축소 및 시점과 종점 통과 형식으로 건강수당 지급방안 강구

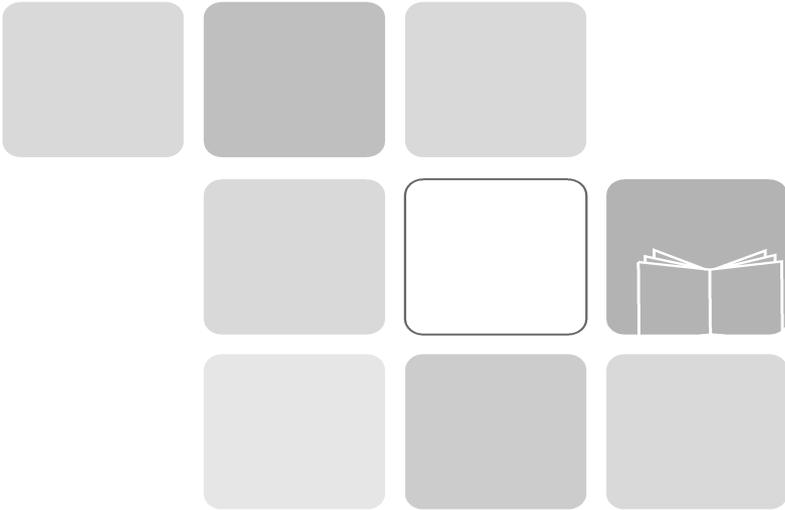

환경복지과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[환경녹지과]

1. 총 평

- 개발과 보존의 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 사업들로 구성되었음
- 주민 및 관광객에게 친환경적인 개발로 사람들에게 친화적으로 다가갈수 있어 좋음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
9	0	0	9	9	0	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
환경 녹지 과 (9)	산림조성팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(5)
	공원관리팀	II-07-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	정상(10)
	공원관리팀	II-09-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	정상(10)
	산림조성팀	II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	정상(10)
	환경지도팀	III-07-51	미세먼지 오염원 저감 대책	정상(21)
	산림조성팀	III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	정상(5)
	산림조성팀	III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의숲 조성	정상(5)
	환경정책팀	III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조 시설 설치	정상(10)
	환경정책팀	IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	정상(5)

나. 세부내용

□ 추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	없음	5%
II-07-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제 건의	공원구역 총량제로 해제면적에 대한 대체부지 확보곤란	10%
II-09-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	없음	10%
II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	없음	10%
III-07-51	미세먼지 오염원 저감 대책	없음	21%
III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	없음	5%
III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성	없음	5%
III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조시설 설치	이어-성산 지구는, 쇠섬-선소지구 시행후 주민의 호응도를 보면서 1회 추경 예산확보 추진	10%
IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염 측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	환경오염측정망 추가설치 미반영(경상남도) ⇒추가설치 재건의	5%

관리번호	I-10-10														
공약명	농축산 6차산업 집중 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 창선면 가인리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 전망대, 바람개비 오솔길, 포토존, 모노레일 등
- 사업비 : 2,100백만원(도비 1,000, 군비 1,100)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,100	0	0	300	1,800	0	0	0
국비	0							
도비	1,000			100	900			
군비	1,100			200	900			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 대상지 조사

■ 향후계획

- 2019년 1월 : 기본계획 수립 용역 시행
- 2019년 3월 : 주민설명회 개최
- 2019년 5월 : 기본계획 수립 용역 완료
- 2019년 6월 : 남해군 투자심사 의뢰
- 2019년 7월 : 남해군공유재산심의회 심의 의뢰
- 2019년 10월 : 부지매입 및 실시설계
- 2020년 1월 : 보물섬 남해 고사리밭 명소 조성사업 시행

관리번호	II-07-32														
공약명	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		공원관리팀		담당자		하상균		전화번호		860-3653		

■ 사업개요

- 위 치 : 상주, 이동, 설천, 고현면 일원(면적 : 68.9km²)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 국립공원 내 사유지 공원구역 일부해제 추진
- 사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0	100	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	100			100				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 5월 19일 : 지역주민 간담회 개최(설천면)
- 2018년 12월 18일 : 지역주민 간담회 개최(상주면)
- 2019년 01월 09일 : 상설협의체 명칭 및 구성원 확정, 회장(부회장) 선출
 - 명 칭 : “한려해상국립공원 구역조정을 위한 남해군 상설협의체”
 - 구성원 : 31명(당초 28명, 고문 및 회원 추가)
 - 회장 및 부회장 선출
 - 회 장 : 박삼준 전 남해군의회 부의장
 - 부회장(4) : 공원구역에 속하는 4개면에 각 1명

■ 향후계획

- 2019년 1월말 ~ 2월초 : 상설협의체 회의개최(환경부 공청회 전)
- 2019년 2월 ~ 7월 : 국립공원구역 타당성조사 용역
- 2019년 2월 ~ 6월 : 주민공청회 및 여론수렴
- 2019년 8월 : 용역 결과를 국립공원관리공단에 건의

■ 문제점 및 대책

- 공원구역 총량제로 해제 면적에 대한 대체부지 확보곤란
⇒ 타당성조사 및 공원계획 수립 시 남해군의 입장 적극 반영

관리번호	II-09-34														
공약명	사계절 꽃피는 화전별곡 추진														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		공원관리팀		담당자		신정우		전화번호		860-3655		

■ 사업개요

- 위 치 : 전 읍·면 대표 관광지 및 유희지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 읍면별 지역명소 1~2개소 선정
 - 무궁화동산, 연꽃단지, 유채·코스모스단지, 사계절 초화류 단지 등
- 사 업 비 : 3,000백만 원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	770	750	750	730	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	3,000		770	750	750	730	
민자등	0						

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 ~ 2월 : 사계절 꽃피는 화전별곡 대상지(꽃길 꽃밭 소공원 화단) 파악
 - 꽃길 조성 : 꽃양귀비 1만본, 금계국 2만본
 - 꽃밭 조성 : 봄꽃(팬지외 1종) 3만본

■ 향후계획

- 읍·면 1화전별곡 조성
 - 읍·면 자료 취합 후 3~4개소 선정 : 2월
 - 차별화된 꽃단지(소공원·화단) 조성(관목류, 계절별 초화류) : 3월 이후
 - ※ 국도 19호선 도로변 및 해안도로변 위주
- 보물섬 800리길 해안변 계절 초화류(유채·코스모스) 식재
- 꽃밭·꽃길 조성
 - 2019년 3월 : 봄꽃(팬지외 1종) 3만본 식재
 - 2019년 6월 : 여름꽃(백일홍외 1종) 4만본 식재
 - 2019년 10월 : 겨울꽃(꽃양배추) 2만본 식재
- 2019년 3월 : 노량꽃탑 식재사업(꽃잔디외 1종)
- 2019년 3월 ~ 10월 : 회전교차로 계절꽃 식재사업(3회)

■ 문제점 및 대책

- 초화류, 관목 식재 후 꽃동산 관리소홀 및 인력 부족
 - ⇒ 읍·면-단체(시민참여)간 협약 체결을 통한 꽃동산 관리 책임제 운영

관리번호	Ⅱ-17-42														
공약명	내산편백 숲 활용 야외체험 학습장 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 산502번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 산림생태체험관, 숲속야영장, 유아숲체험원,
숲속어드벤처, 난대식물원, 산책로, 모노레일 등
- 사 업 비 : 3,700백만원(국비 1,500, 도비450, 군비 1,750)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,700	0	600	200	950	950	1,000	0
국 비	1,500				500	500	500	
도 비	450				150	150	150	
군 비	1,750		600	200	300	300	350	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 3월 : 2018년 제1차 남해군 지방재정 투자심사 완료
- 2018년 6월 : 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 용역 완료
- 2018년 8월 : 남해군공유재산심의회 심의 완료

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 산림재해시설(사방댐, 계류보전) 사업 시행(경남도)
- 2019년 2월 : 힐링숲길 조성사업 시행
- 2019년 3월 : 군특사업(자생식물원, 유아숲체험원) 신청
- 2020년 2월 : 사업시행

관리번호	Ⅲ-07-51														
공약명	미세먼지 오염원 저감 대책														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				21
주관부서	환경녹지과		담당팀		환경지도팀		담당자		문경택		전화번호		860-3274		

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 환경녹지과 소관

분야	사업명	사업내용	사업비(백만 원)		
			2018	2019	2020~2022
총계			742	808	2,424
산업	대기배출사업장 점검 강화	-고농도 발생시준(봄, 겨울) 집중단속 -사용연료 황함유량 검사실시	-	-	-
	비산먼지 발생사업장 점검 실시	-건설공사장 특별점검 실시	-	-	-
수송	노후 경유차 조기 폐차지원	-노후 경유차 폐차 지원(1,000대)	177	306	918
	LPG화물차 신차 구입 지원	- 경유차 폐차 후 LPG화물차 신차 구입 지원(50대)	-	32	-
	어린이 통학차량 LPG 차량 전환사업	-어린이 통학차량 LPG차량 전환(10대)	-	20	60
	건설기계 배출 저감사업	-건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진 교체 지원(20대)	-	55	165
	운행차 배출가스 점검 강화	-비디오, 측정기기, 무료점검 실시 -홍보(언론, 캠페인 등) 및 교육	-	-	-
	전기자동차 보급사업	-전기자동차 보급(100대) (환경정책팀 추진)	552	355	1,065
	전기이륜차 보급사업	-전기이륜차 보급(30대) (환경정책팀 추진)	13	13	39
생활	미세먼지 마스크 보급	-취약계층(어린이, 65세이상 기초생활 수급자 등)미세먼지 마스크 지원(50,000개)	-	9	27
	미세먼지 및 오존 신호등 설치	-신속히 미세먼지 및 오존에 대응하여 피해를 예방할 수 있도록 신호등 설치(4개소)	-	10	30
	저녹스 보일러 교체	-가정용 노후보일러 교체 설치지원(200대)	-	8	24
	도로청소차 운영	-월1회이상 실시(건설교통과 협조)	-	-	-
	불법소각 집중단속	-고농도 발생시준(봄, 겨울) 집중단속 -마을방송, 홈페이지 등 사전 홍보 (폐기물관리팀 협조)	-	-	-

- 주민복지과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만 원)		
		2018	2019	2020~2022
경로당 및 어린이집 공기청정기 보급	-경로당 공기청정기 보급(251개소) -어린이집 공기청정기 설치(88개소)	584	16	-

- 농업기술과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만 원)		
		2018	2019	2020~2022
공기정화 식물 활용 미세먼지 예방	-재배농가 시설물 유지 및 보수비 지원 -농가지원(4개소)	-	50	150

○ 사업비 : 106백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,774	0	1,326	874	858	858	858	0
국비	1,973		493	370	370	370	370	
도비	754		222	133	133	133	133	
군비	1,947		611	346	330	330	330	
민자등	100		0	25	25	25	25	

■ 추진상황(실적)

○ 환경녹지과

- 2018년 : 대기배출 및 비산먼지발생사업장, 운행차 배출가스, 불법소각 단속 실시
- 2018년 5월 : 취약계층 미세먼지 마스크 보급(4,071개)
- 2018년 12월 : '18년 노후경유차 폐차 지원사업(156대) 및 전기차(자동차 20대, 이륜차 5대) 보급사업 완료

○ 주민복지과 : '18년 하반기 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 중(251개소)

■ 향후계획

- 환경녹지과 : 연차별·분야별 미세먼지 저감사업 추진
- 주민복지과 : 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 완료
- 농업기술과 : 재배농가별 시설물 유지 및 보수비 4개년도 4개소 지원

관리번호	Ⅲ-13-57														
공약명	연죽~현촌간 임도개설														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 연죽~현촌마을
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업내용 : 임도개설 15km
- 사업비 : 3,000백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	0	350	400	400	400	1,450
국비	0							
도비	0							
군비	3,000			350	400	400	400	1,450
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 임도노선 계획 정비

■ 향후계획

- 2019년 1월 : 임도 기본계획 및 실시설계 용역시행
- 2019년 2월 : 제4차임도설치계획 변경 신청
- 2019년 3월 : 임도타당성 평가 실시
- 2019년 4월 : 주민설명회 개최
- 2019년 5월 : 임도 기본계획 및 실시설계 용역 완료
- 2019년 6월 : 임도개설(1차) 사업 시행
- 2019년 11월 : 임도개설(1차) 사업 준공

관리번호	Ⅲ-16-60														
공약명	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	환경녹지과		담당팀		산림조성팀		담당자		김평주		전화번호		860-3663		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 망운산 산림욕장
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 숲속도서관, 체육시설 정비
- 사업비 : 75백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	75	0	0	45	10	10	10	0
국비	0							
도비	0							
군비	75			45	10	10	10	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 산림욕장 정비계획 수립

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 실시설계 시행
- 2019년 3월 : 산림욕장 정비사업 시행
- 2019년 5월 : 숲속도서관 설치
- 2019년 7월 : 숲속도서관 운영

관리번호	Ⅲ-17-61														
공약명	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구 철새탐조시설 설치														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	환경녹지과		담당팀		환경정책팀		담당자		문민근		전화번호		860-3253		

■ 사업개요

- 위 치 : 강진만 바닷가(선소-토촌, 이어-성산)
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 탐조대(66㎡)2개소, 망원경 8개
- 사업비 : 600백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	600	0	0	600				0
국비	150			150				
도비	45			45				
군비	405			405				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 국가생태탐방로 사업 1개소 반영(선소-토촌)
- 2019년 1월 : 국가생태문화 탐방로 설계입찰 완료

■ 향후계획

- 철새 전망대 선진지 견학 실시(공모사업 우수작인 인천대교)
- 철새 탐조시설이 관광 상품화 될 수 있도록 아름답게 조성

■ 문제점 및 대책

- 2019년 당초예산 미 편성으로 인하여 1회 추경 시 반영
- 예산액 : 300백만 원

관리번호	IV-11-73														
공약명	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	환경녹지과		담당팀		환경정책팀		담당자		서한경		전화번호		860-3254		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 고현, 설천, 서면
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대기오염측정망 설치 건의 및 전광판 설치 1개소
- 사 업 비 : 450백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	450	0	0	100	0	350	0	0
국비	175					175		
도비	175					175		
군비	100			100				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)


- 2018년 08월 : 고현면 대기환경측정망 전광판 송출가능 여부 협조 요청(남해군⇒하동화력)
- 2018년 09월 : 대기오염측정망 추가 설치 요청(남해군⇒경상남도)
- 2019년 이월 : 설치위치 현지 확인 완료

■ 향후계획

- 2019년 01월~03월 : 대기환경전광판 설치 설계용역
- 2019년 03월~05월 : 대기환경전광판(1개소) 제작 설치
- 2019년 05월~ : 대기환경전광판 운영

■ 문제점 및 대책

- 대기오염측정망 추가 설치 건의에 대해 경상남도 대기오염 측정망 운영계획(2016~2020년) 미반영
⇒ 수정반영 건의 및 2021이후 운영계획 반영 요청

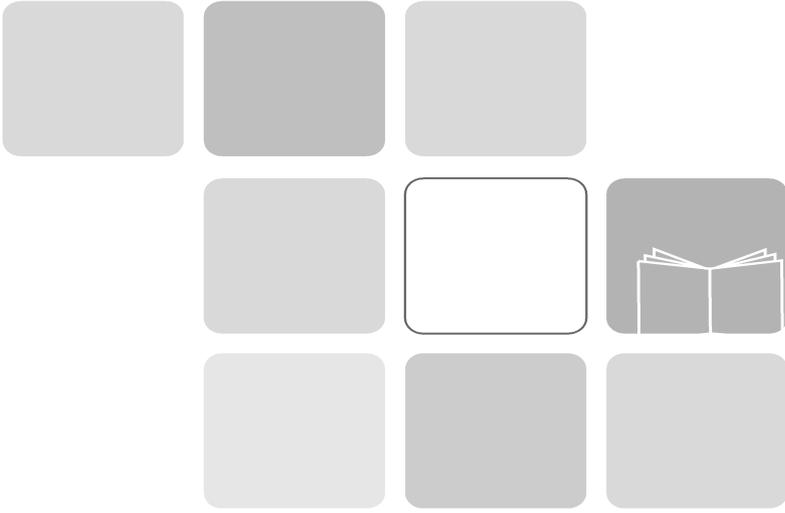

해양수산과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[해양수산과]

1. 총 평

- 공약사업 수행을 위한 예산투입, 계획수립이 완료되었으며, 사업확정과 사업대상자 선정을 통해 신속한 사업 추진
- 사업 초기 신속 추진하여 기간 내 공약이행 목표 달성 가능

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
9	0	2	7	7	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
해양 수산 과 (9)	해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	이행후계속추진
	연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	정상(10)
	수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	정상(30)
	연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	정상(50)
	해양보전팀	I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	이행후계속추진
	양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	정상(10)
	양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	정상(10)
	양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	정상(30)
	연안관리팀	II-05-30	상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간'	정상(30)

나. 세부내용

이행 후 계속추진

관리번호	제 목	완료연월일
I -17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	2018.12.31
I -22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	2018.12.31

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I -18-18	미조 설리 관광어항 개발	해당없음	10%
I -19-19	연안바다목장 확대	해당없음	30%
I -20-20	바다 위 해상횃집 도입	해당없음	50%
I -23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	해당없음	10%
I -24-24	스마트 양식장 시범사업	해당없음	10%
I -25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	해당없음	30%
II -05-30	상주해수욕장 '태양의 인사', '바다오르간'	해당없음	30%

관리번호	I -17-17														
공약명	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100
주관부서	해양수산과		담당팀		해양보전팀		담당자	이지홍	전화번호		860-3379				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안 해역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용 : 적조방제, 해양폐기물 처리, 지정해역 위생관리
- 사업비 : 3,896백만원('18~'23)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	6,170	860	860	860	860	910	910	910
국비	4,756	664	664	664	664	700	700	700
도비	598	82	82	82	82	90	90	90
군비	816	114	114	114	114	120	120	120
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 황토살포기(대형2, 중형3), 형망선 35척, 어업인 240명 동원, 황토371톤 살포하여 적조방제 실시로 적조피해 미발생
- 2018년 10월 : 어업폐기물 처리사업으로 270톤 처리 완료
- 2018년 10월 : 지정해역 위생관리 가정집 정화조 296가구 분뇨 수거 완료 해양쓰레기 정화사업으로 300톤 처리 완료

■ 향후계획

- 적조방제
 - 어민대상 적조방제 교육실시 및 적조구제 황토확보(11,000톤)

- 가두리 이동 안전해역 지정(1개소): 미조면 조도 인근 30ha
- 폐사체 매몰지 사전 확보: 남해읍 남변리 일원 20,000m²
- 공공용 방제장비 황토살포기(대형2, 중형3) 사전 점검

○ 해양폐기물 처리

- 2019년 1월 : 해양쓰레기 정화사업(230톤) 입찰 후 사업추진
- 2019년 1월 : 조업중 인양쓰레기 수매사업(130톤) 입찰 후 사업추진
- 2019년 2월 : 어업폐기물 처리사업(300톤) 입찰 후 사업추진
- 2019년 3월 : 태풍재해쓰레기 수거처리사업(270톤) 입찰 후 사업추진

○ 지정해역 위생관리

- 2019년 3월·6월(2회) : 강진만 권역 가정집 정화조 약 32가구
분뇨수거처리 예정

■ 문제점 및 대책

- 해양쓰레기, 어업폐기물 처리 단가의 증가로 예산 증액 필요

관리번호	I-18-18														
공약명	미조 설리 관광어항 개발														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	해양수산과		담당팀		연안관리팀		담당자		황성호		전화번호		860-3373		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 설리항 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 방파제 연장(L=200m), 요트 계류시설(30척 규모), 해양 레포츠 계류시설, 주차장 조성, 어민편의시설 등
- 사 업 비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	15,000			5,250	9,750			
국 비	10,500			3,675	6,825			
도 비	1,350			473	877			
군 비	3,150			1,102	2,048			
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 2015년 5월 : 설리항 어항개발계획 변경 협의 완료
- 2018년 10월 : 어촌뉴딜300사업 공모 신청
- 2018년 12월 : 2019년 어촌뉴딜300사업 대상지 최종 선정

■ 향후계획

- 2019년 1월 ~ 8월 : 설계용역 시행
- 2019년 10월 : 공사 착공

관리번호	I -19-19														
공약명	연안바다목장 확대														
사업구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관부서	해양수산과		담당팀		자원조성		담당자		홍성기		전화번호		860-3482		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전 해역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : 해삼서식지기반, 수산종자방류, 마을앞바다소득개발 등
- 사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,000	0	2,363	1,494	1,693	2,150	2,150	2,150
국비	5,940		1,120	820	1,000	1,000	1,000	1,000
도비	1,605		245	155	155	350	350	350
군비	3,421		695	388	388	650	650	650
민자등	1,034		303	131	150	150	150	150

■ 추진상황(실적)

- 2019년 2월 : 사업품종 및 대상해역 선정
- 2019년 3월 : 대행입찰 및 사업시행
- 2019년 9월 : 군특 및 국비지원사업 신청
- 2019년 10월 : 중앙기관 방문 및 협의 예산확보

■ 향후계획

- 자원조성 관련사업 내실 있게 추진하여 연내 마무리
- 연안바다목장, 소규모바다목장, 바다숲, 해중림, 산란지조성 등 중앙부처 사업과 연계하여 우리군 계획 수립 추진

관리번호	I -20-20														
공약명	바다 위 해상횃집 도입														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			50
주관 부서	해양수산과		담당팀		연안관리팀		담당자		황성호		전화번호		860-3373		

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 어항 구역(육지부 횃집 밀집지역 제외)
- 관련법 : 어촌·어항법 제2조(정의), 제38조(어항시설의 사용허가 등), 건축법 제6조의 3(부유식 건축물의 특례)
- 관련법 검토내용
 - 2016. 1. 19일 건축법 개정된 건축법 제6조의3(부유식 건축물의 특례)에 따라 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면 위에 고정된 인공대지를 설치하고 그 위에 설치한 건축물은 건축협약이 가능함

■ 추진실적

- 2018년 4월 : 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의
- 2018년 4월 : 어항시설 점사용 허가 통보
- 2018년 5월 : 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 완료(일반음식점, 숙박시설 등)
- 2018년 10월 : 건축공사 착공

■ 향후계획

- 2019년 10월 : 어항시설 점사용료 부과, 건축 준공 및 운영

관리번호	I -22-22														
공약명	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100
주관 부서	해양수산과		담당팀		해양보전팀		담당자	신동열	전화번호		860-3378				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안 해역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용 : 양식어장 정화(바닥경운, 황토살포·고르기, 페어망·어구 및 패각인양 처리 등)
- 사 업 비 : 1,734백만원('18~'23)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,984	250	250	270	300	300	300	314
국비	1,586	200	200	216	240	240	240	250
도비	120	15	15	16	18	18	18	20
군비	278	35	35	38	42	42	42	44
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 1월~12월 : 6개 어촌계(강진, 문항, 심천, 다천, 냉천, 평산2) 545.2ha 정화사업 완료

■ 향후계획

- 2019년 1월 : '20년 양식어장 신청 및 '19년 사업 실시설계
- 2019년 2월~4월 : 정화사업 추진
- 2019년 5월 : 사업검측
- 2019년 6월 : 폐기물 처리 및 사업완료

관리번호	I-23-23														
공약명	양식업 재난 대비 시스템 구축														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	해양수산과		담당팀		양식산업팀		담당자		원용덕		전화번호		860-3363		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 가두리시설 현대화, 백신 공급, 양식재해보험료 지원
- 사업비 : 4,337백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,337	1,139	957	950	950	341	0	0
국비	1,033	227	257	256	256	37		
도비	666	176	139	137	137	77		
군비	1,546	403	324	320	320	179		
민자등	1,092	333	237	237	237	48		

■ 추진상황(실적)

- 2019년 1월 : 2019년 사업대상자 선정

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 2019년 추가사업대상자 선정(가두리시설 현대화)
- 2019년 3월 : 2019년 사업 착공
- 2019년 12월 : 2019년 사업 준공

관리번호	I -24-24														
공약명	스마트 양식장 시범사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	해양수산과		담당팀		양식산업팀		담당자		원용덕		전화번호		860-3363		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : ICT활용 스마트 가두리양식장 기반 구축
- 사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	600	0	150	150	150	150	0	0
국비	240		60	60	60	60		
도비	90		22.5	22.5	22.5	22.5		
군비	210		52.5	52.5	52.5	52.5		
민자등	60		15	15	15	15		

■ 추진상황(실적)

- 2018년 5월 : 2018년 수산 u-IT융합 모델화사업 공모 선정
- 2018년 11월 : 도비 및 군비 확보
- 2018년 12월 : 사업대상자 신청접수

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 사업대상자 선정
- 2019년 3월 : 사업 착공
- 2019년 6월 : 사업 준공

관리번호	I -25-25														
공약명	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	해양수산물과		담당팀		양식산업팀		담당자		서연우		전화번호		860-3362		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 수산식품산업 거점단지, 위판장 건립, 수산시장 개선
- 사업비 : 16,816백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	16,816	300	15,616	900	0	0	0	0
국비	8,073	90	7,713	270				
도비	1,926		1,845	81				
군비	4,585	90	4,306	189				
민자등	2,232	120	1,752	360				

■ 추진상황(실적)

- 2018년 4월 : 수산식품산업거점단지 조성사업 착공
- 2018년 5월 : 창선 단항위판장 시설개선사업 준공
- 2018년 12월 : 남면 평산위판장 건립사업 착공

■ 향후계획

- 2019년 6월 : 수산식품산업 거점단지 조성 완료
- 2019년 6월 : 평산위판장 건립사업 준공
- 2019년 9월 : 수산시장 개선(처리저장시설)사업 준공

관리번호	II-05-30														
공약명	상주해수욕장 '태양의인사', '바다오르간'														
사업구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관부서	해양수산과		담당팀		연안관리팀		담당자	조민수	전화번호		860-3374				

■ 사업개요

- 위치(대상) : 상주면 상주은모래비치 내
- 사업기간 : 2019 ~ 2020년
- 사업내용 : 야간 해수욕장 이용 조명시설 및 경관조명 설치
- 사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	450		150	30	270			
국비	0		0	0	0			
도비	75		75	0	0			
군비	375		75	30	270			
민자등								

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 상주은모래비치 야간조명 시설 설치공사 착공(4기)

■ 향후계획

- 2019년 2월 : 해수욕장 활성화(태양의인사, 바다오르간 포함) 기본구상 용역 착수
- 2019년 3월 : 상주은모래비치 야간조명 시설 설치 완료
- 2019년 6월 : 해수욕장 활성화 기본구상 용역 완료

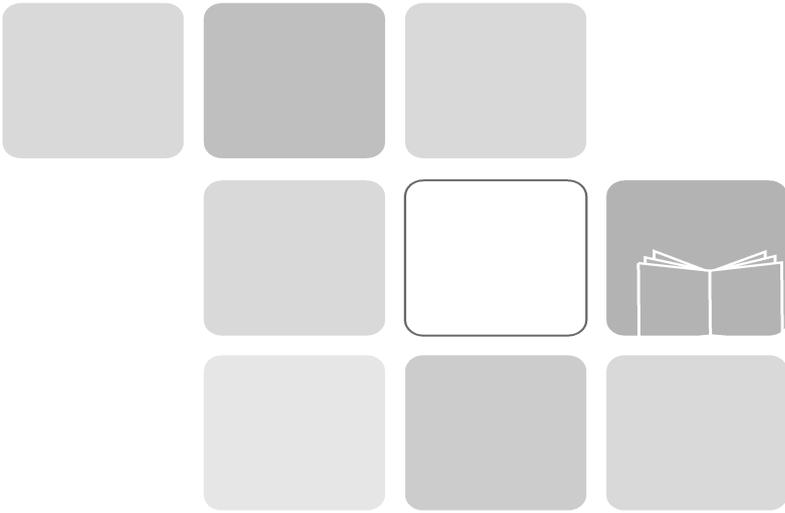

도시건축과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[도시건축과]

1. 총 평

- 남해군의 아름다운 자연경관을 훼손하는 사례 증가에 따라 수려한 자연경관과 청정환경을 보전하기 위한 특단의 대책 마련
- 공공시설물 조성할 때 보다 많은 군민들이 참여할 수 있도록 하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
2	1	1	1	1			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
도시 건축 과 (2건)	복합민원팀	Ⅲ-08-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	완료
	경관디자인팀	Ⅲ-09-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	정상(10)

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
Ⅲ-08-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	2018.11.27

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-09-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	없음	10%

관리번호	Ⅲ-08-52														
공약명	아름다운 도시환경과 경관 보존														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			100
주관 부서	도시건축과		담당팀		복합민원팀		담당자		김철현		전화번호		860-3085		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 전역
- 시행방법 : 내부방침으로 시행
- 대규모 개발사업 범위
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제55조에 따른 허가규모 초과(경남도 심의 대상)의 경우
 - 전기발전시설(규모제한 없음)

■ 추진상황(실적)

- 2018. 11. : 자연경관 보존방안 업무보고 방침결재
- 2018. 12. : 태양광 허가를 위한 도시계획위원회 심의 및 주민의견 반영 등에 따른 태양광 개발행위 허가 반려(4건)

■ 향후계획

- 2019. 2. : 발전시설 허가기준 강화 등 조례 개정
- 향후 대규모 개발사업 시행 시 주민의견 청취 및 의견반영

■ 문제점 및 대책

- 인허가처리 시 주민의견 반영에 대한 법적 근거 미약
- 최대한 주민과 사업자간 협의를 통하여 주민의견이 반영될 수 있도록 인허가 업무 추진

관리번호	Ⅲ-09-53														
공약명	공공시설물 디자인 주민참여 확대														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	도시건축과		담당팀		경관디자인팀		담당자	홍유리	전화번호		860-3074				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 시 공공디자인 분야 협력 및 디자인 주민참여 등 주민의견수렴 장치 제도화
- 사 업 비 : 200백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200		200					
국비	0							
도비	0							
군비	200		200					
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018. 12. : 입찰공고
- 2018. 12. : 제안서 평가위원 구성(공개모집)

■ 향후계획

- 2019. 1. 11. : 입찰 재공고
- 2019. 1. 24.~30. : 제안서 재 접수 및 평가
- 2019. 2. : 업체계약 및 용역시행
- 2019. 11. : 용역 완료

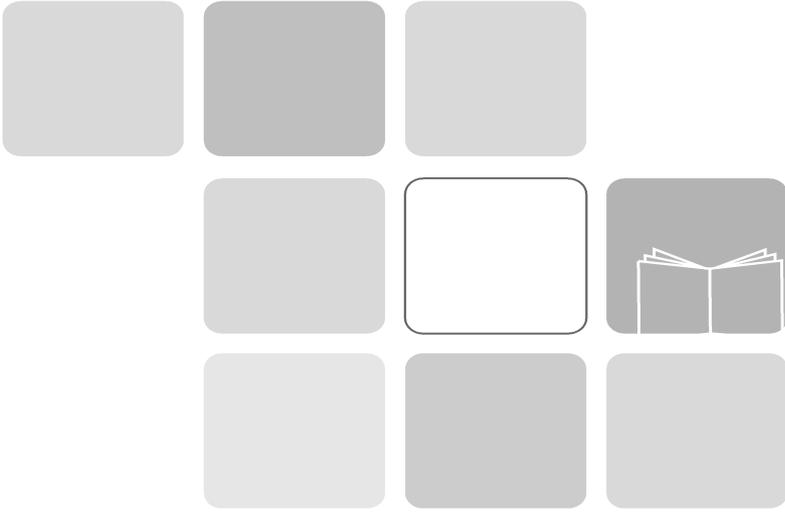

건설교통과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[건설교통과]

1. 총 평

- 민선7기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 11건으로 정상 6건과 일부추진 5건 진행하고 있음
- 일부추진중이 5건은 사업계획 미반영, 부지보상협의 지연, 사업비 미확보로 인한 것으로 사업 추진을 위해 지속적으로 노력하고 있음

2. 총 괄(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
11			11	6	5		

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
건설 교통 과 (11)	교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	정상(50%)
	도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	일부추진
	교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	정상(50%)
	교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	정상(20%)
	도로팀	Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일부추진
	교통지도팀	Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	정상(10%)
	도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	일부추진

부서	소관부서	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
	도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선확포장공사조기추진 건의	일부추진
	도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	일부추진
	교통지도팀	Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	정상(40%)
	교통지도팀	Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	정상(90%)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	-	50%
Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	-	50%
Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	-	20%
Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	-	10%
Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	-	40%
Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	-	90%

추진중(일부추진)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진해야 하고, 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화로 적극적인 사업 건의 필요	10%

Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	제5차국도국지도건설 계획에 반영되어야 함	10%
Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	부지보상 협의 지연 예상	10%
Ⅲ-12-56	국도3호선확포장공사 조기추 진 건의	제5차국도국지도건설 계획에 반영되어야 함	0%
Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요	10%

관리번호	Ⅲ-02-46														
공약명	남해버스터미널 운영 정상화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○			○				50
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		정광수		전화번호		860-3452		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 남해버스공용터미널
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용 : 남해버스공용터미널 운영 정상화
- 사 업 비 : 비예산

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018.09.20. : 여객자동차터미널사업 면허 신청서 반려처분
- 2018.10.31. : 제10회 경남행정심판위원회 심리(기각)
- 2018.12.07. : 상인회, 대표소소유자, 행정간 1차 회의
- 2018.12.20. : 대표소 및 대합실 감정평가 실시

■ 향후계획

- 감정평가 결과에 따른 상인회와 대표소 소유자간의 중재
- 장기화시 제3의 장소 물색 및 남해군 매입 추진

관리번호	Ⅲ-3-47														
공약명	사동팔달 교통망 확충														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○	○			○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)
지방도1024호선(삼동 영지 ~ 지족 남면 평산 ~ 가천 ~ 석교)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 5개 구간 사업계획 확정
- 사업비 : 2,500억원(국가, 경상남도 시행)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,500	0	0	0	60	250	250	1,940
국비	1,800				20	100	100	1580
도비	700				40	150	150	360
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2017년 12월 : 경상남도 도로건설계획('16~'20) 반영 확정
- 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청, 경상남도 사업 조기 추진)
 - 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족) : 국도국지도 건설계획 반영 추진

■ 향후계획

- 2020년 6월 : 제5차 국도국지도건설 5개년 계획('21~'25)반영 추진

■ 문제점 및 대책

- 국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진
- 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요

관리번호	Ⅲ-04-48														
공약명	소형버스 투입 대중교통 개선														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자	박법진	전화번호		860-3453				

■ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌버스 19대
- 사업기간 : 2019년~
- 사업내용 : 군내 운영하는 30개노선을 농어촌 버스로 전환,
운송사업자와 버스 소형화 협의
36인승이상 9미터 이상 ⇒ 16~35인승 9미터 미만
- 사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	50	0	0	50	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	50			50				
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018.12.30. : 남해군 시외버스 운송원가분석 조사 용역
- 2019.01.01. : 시외버스(일반) ⇒ 농어촌 버스 전환(30개노선)
- 2019.01.31. : 남해군 대중교통 체계 개편 용역 시행

■ 향후계획

- 2019.08.01. : 농어촌 버스 노선 확정 및 시행
- 차령(9년) 초과 차량부터 운송업체와 협의후 소형화 추진

관리번호	Ⅲ-05-49														
공약명	관광객 교통문제 해결 방안 강구														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				20
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		박법진		전화번호		860-3453		

■ 사업개요

- 버스정보 시스템 구축 및 관광지 연계 버스 노선 조정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 버스정보 수집장치 35대, 단말기 30개소
- 사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	514	0	0	50	400	32	32	0
국비	200				200			
도비	0							
군비	314			50	200	32	32	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2019.01.31. : 남해군 대중교통 체계 개편 용역 시행

■ 향후계획

- 2019년 5월 : 국토교통부 버스정보시스템 구축 공모 신청
- 2020년 8월 : 버스정보 시스템 설계 및 구축
- 2020년 10월 : 시범 운영 및 개시
- 국토부에서 추진하는 농촌형 교통모델 연계추진

관리번호	Ⅲ-6-50														
공약명	남해~여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○					○			○				10
주관부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 ~ 여수시 삼일도(국도77호선)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2029년
- 사업내용 : 도로 개설 L=7.3km[접속도로 L=1.37km, 터널 5.93km
(해저 4.2, 육상 1.73)]
- 사 업 비 : 5,040억원(국비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	504,000	0	0	0	0	0	4,000	500,000
국비	504,000						4,000	500,000
도비	0							
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2002년 2월 : 예비타당성 조사(국토개발연구원)
- 2011년 12월 : 기본계획수립(한국교통연구원)
- 2015년 1월 : 제4차 국토국지도건설 5개년('16~'20)계획 대상 반영
- 2015년 4월 : 예비타당성 재조사(한국개발연구원)
- 2017년 12월 : 제5차 국토국지도건설 5개년('21~'25)계획 대상지 제출
- 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청 사업 조기 추진)

■ 향후계획

- 2020년 6월 : 제5차 국토국지도건설 5개년('21~'25) 반영 추진
- 2022년 1월 : 사업추진(설계 착수)

■ 문제점 및 대책

- 제5차 국토국지도 건설계획에 반영되어야 함

관리번호	Ⅲ-10-54														
공약명	경로우대 버스 승차권 지급														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		박법진		전화번호		860-3453		

■ 사업개요

- 사업대상 : 만70세 이상의 어르신(남해군 주민등록 등재)
- 사업기간 : 2020년 ~
- 사업내용 : 남해군 내 버스운행노선 탑승요금 지원
- 사업비 : 연간 700백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	2,800	0	0	0	700	700	700	700
국비	0							
도비	0							
군비	2,800				700	700	700	700
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

○

■ 향후계획

- 2019년 3월 : 경로우대 승차권 지원 사례 조사
- 2019년 11월 : 사업의 타당성 조사 용역 및 조례제정
- 2020년 1월 : 교통카드회사 및 운송업체간 협약체결

■ 문제점 및 대책

- 96~2000년까지 노인 버스승차권 지급후 중단 ⇒ 민원발생
- 요금단일화 및 노인기초 연금으로 대체방안 검토

관리번호	Ⅲ-11-55														
공약명	주민생활 불편도로 개선사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진	전화번호		860-3314			

■ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 선소~차산 도로, 삼동 시문~동천 확포장, 삼동면 지족 진입로, 삼동면 소재지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 도로 3개소 정비(굴곡개량 1개소, 확장 2개소)
 - 삼동면 소재지 일원 주차장 조성 1식
- 사 업 비 : 18,513백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	18,513	0	1,893	520	2,200	4,000	4,000	5,900
국비	8,450		250	250	1000	2000	2000	2950
도비	678		678					
군비	9,385		965	270	1200	2000	2000	2950
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2017년 12월 ~ 2019년 3월 : 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 추진
- 2018년 6월 ~ 2020년 12월 : 삼동 시문~동천 확포장 기본계획 및 실시 설계

■ 향후계획

- 2019년 3월 : 삼동면 지족 진입로 실시설계 완료
 - 2019년 3월 ~ 2022년 12월 : 사업추진
- 2019년 3월 : 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 준공

■ 문제점 및 대책

- 부지 보상 협의 지연 예상

관리번호	Ⅲ-12-56														
공약명	국도3호선 확포장공사 조기추진 건의														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○				○				○				0
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 도로 확포장 11km 사업계획 확정
- 사업비 : 1,800억원 **백만원**(국가시행)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,800	0	0	0	20	100	100	1,580
국비	1,800				20	100	100	1580
도비	0							
군비	0							
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청)
- 2018년 10월 ~ 2020년 12월 : 관련계획 반영 지속 추진

■ 향후계획

- 2021년 10월 ~ 2022년 12월 : 사업계획 확정 및 설계 추진

■ 문제점 및 대책

- 제5차 국도국지도 건설계획에 반영되어야 함

관리번호	Ⅲ-14-58														
공약명	미개통 해안도로 단계별 개설														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	건설교통과		담당팀		도로팀		담당자		윤한진		전화번호		860-3313		

■ 사업개요

- 위 치 : 서면 장항 ~ 정포, 창선 지족 ~ 당저, 창선 오용 ~ 상신
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(개설 3개소)
- 사업비 : 12,620백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	12,620	300	200	400	500	500	500	10,220
국비	5,860				250	250	250	5110
도비	200		200					
군비	6,560	300		400	250	250	250	5110
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 9월 ~ 2019년 12월 : 창선 지족 ~ 당저 토지보상 추진
- 2018년 12월 ~ 2022년 12월 : 창선 오용 ~ 상신 토지보상 추진

■ 향후계획

- 2019년 1월 ~ : 서면 장항 ~ 정포 사업계획 수립(농어촌도로 지정 후 추진)
- 2019년 2월 ~ 2022년 12월 : 설계 착수
- 2020년 1월 ~ 2023년 12월 : 창선 오용 ~ 상신 공사 추진
- 2020년 1월 ~ 2023년 12월 : 창선 지족 ~ 당저 공사 추진

■ 문제점 및 대책

- 사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요

관리번호	IV-04-66														
공약명	노약자가 안전한 교통시설 설치														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				40
주관부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자		강상욱		전화번호		860-3456		

■ 사업개요

○ 사업내용

- 보행신호 음성안내 보조장치, LED투광등, 차선발광 도색
- 도로 확포장공사 추진시 안전시설 설치

○ 사업기간 : 2019년 ~

○ 사업비 : 연간 644백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	644	0	0	244	100	100	100	100
국비	0							
도비	0							
군비	644			244	100	100	100	100
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

○ 2018.12.20. : 노후 교통신호등 교체 공사 시행

- 사업비 : 162,500천원(도급액 : 128,473 관급액 : 34,027)
- 사업량 : 신호등주 12분, LED등 10조, 신호제어기 1분,
표지판 34매 등

■ 향후계획

- 2019년 3월 : 건널목 LED투광등 공사 시행
- 교통사고 다발지역 교통신호등 설치

관리번호	IV-10-72														
공약명	보물섬 행복택시 확대 운영														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				90
주관부서	건설교통과		담당팀		교통지도팀		담당자	배지성	전화번호		860-3455				

■ 사업개요

- 근거규정 : 남해군 대중교통 소외지역 보물섬 행복택시 운영조례
- 대상마을 : 6개면 13개마을(당초 5개면 10개마을)
 - 이동(다정,석평,금석,초곡), 상주(노도,벽련,금포), 남면(양지)
 - 삼동(내동천, 수곡, 고암), 서면(금곡), 고현(소차면)
- 운행횟수방법 : 30회/월, 이용권(30매), 인구비례 차등
- 이용기준 : 면소재지 1대당 100원/ 타읍면 소재지 1,300원
(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	422	51	52	59	65	65	65	65
국비	84		12	12	15	15	15	15
도비	105	21	12	12	15	15	15	15
군비	233	30	28	35	35	35	35	35
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018.09.03. : 행복택시 확대를 위한 추가마을 조사
 - ※ 마을회관에서 버스승강장까지 500m이상 떨어진 마을

■ 향후계획

- 남해군 교통체계 개편 용역결과를 바탕으로 놓어준 버스 노선과 보물섬 행복택시 운행 연계추진
- 국토부에서 추진하는 농촌형 교통모델(택시,버스)연계추진

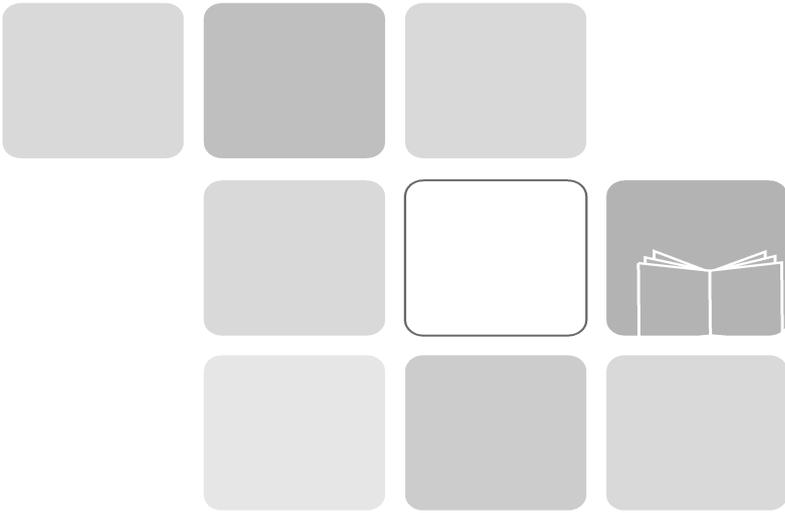

보 건 소

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[보건소]

1. 총 평

- 치매 환자와 가족의 고립을 방지하고, 치매 환자가 지역에서 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지역사회 기반마련
- 분만 취약지에 따른 출산가정의 건강관리 및 산후조리비 지원으로 산모와 신생아의 건강증진을 도모하고, 국가의 출산 장려 시책 및 사회적 분위기 조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
2			2	2			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
보건소 (2)	치매예방팀	IV-01-63	생활터 치매 행복마을 조성	25
	건강생활팀	IV-09-71	임산부 고충 경감	50

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
IV-01-63	생활터 치매 행복마을 조성	주민참여를 위한 홍보 활동 강화	25%
IV-09-71	임산부 고충 경감 (출산가정 건강관리 지원 사업)	해당사항 없음	50%

관리번호	IV-01-63														
공약명	생활터 치매 행복마을 조성														
사업 구분	완료시기	사업주체				예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				25
주관 부서	보건소		담당팀		치매예방팀		담당자	정현주	전화번호		860-8692				

■ 사업개요

- 위 치 : 치매고위험 마을 및 공동주거 시설
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 지역주민과 함께하는 치매예방 관리, 돌봄 마을 조성, 사회지지 연계망 구축, 안전 환경개선 등
- 사 업 비 : 305백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	305		20	45	45	80	115	-
국 비	122.5			17.5	17.5	35	52.5	
도 비	52.5			7.5	7.5	15	22.5	
군 비	130		20	20	20	30	40	
민자등								

■ 추진상황

- 2018년 7월~ : 치매행복마을 인지프로그램 운영(주2회)
- 2018년 9월~ : 치매 안전망 구축(가스안전밸브 61세대 설치)
최종평가(만족율 95%, 인지점수 3점 향상)
- 2018년 12월 : 제1호 치매행복마을 탄생(설천면 덕신)
- 2018년 12월 : 19년 치매행복마을 2개소
(남해읍 선소, 서면 남정마을) 선정/ 누계 : 3개소(덕신포함)

■ 향후계획

- 행복마을 주민 예방관리 프로그램 운영 : 월2회
- 주민참여 유도 : 치매파트너, 치매리더 양성
- 치매행복마을 커뮤니티 케어 지원 : 보건기관, 행정복지센터, 치매등대지기, 선도기관 참여와 군민 홍보 강화
 - 노인 서비스 제공기관 대상교육 : 치매행복 마을 조성 홍보
- 치매친화적 환경 조성 및 지역자원 발굴, 연계 : 고위험군 GPS 보급 및 가스안전밸브 차단기 보급 등

■ 문제점 및 대책

- 고령화 지역인 우리군의 치매 조기검진과 적기관리 중요성에 대한 청·장년층의 관심 저조 및 연계망 미흡
 - ⇒ 치매파트너, 등대지기, 선도기관, 선도단체 참여를 위한 현장방문 홍보활동 지속 전개

관리번호	IV-09-71														
공약명	임산부 고충 경감														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				50
주관 부서	보건소		담당팀		건강생활팀		담당자		이연주		전화번호		860-8720		

■ 사업개요

- 사업대상 : 출산일 3개월 전부터 군내에 주민등록을 둔 실제 거주하고 있는 부모 및 출생아
- 사업기간 : 2019.1~
- 사업내용
 - 임산부 등록 관리 및 정보제공
 - 산후조리비용 지원
 - 산후조리원 이용 : 최대 1,000천원(본인부담금 중)
 - 산후조리원 미이용 : 500천원(정액 지급)
 - 산모·신생아 건강관리 지원 : 최대 500천원(본인부담금 중)
 - 영유아 로타바이러스 예방접종비 지원 : 최대 300천원
- 사업비 : 189백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,111	0	189	204	221	239	258
국비	0		0	0	0	0	0
도비	0		0	0	0	0	0
군비	1,111		189	204	221	239	258
민자등	0		0	0	0	0	0

■ 추진상황 및 향후계획

- 임산부 등록 홍보(홈페이지, 지역신문 등) : '19.1~ 계속
- 읍·면행정복지센터 및 유관기관 안내 공문 발송 : '19.1~ 계속
- 사업신청 안내 및 서비스 지원 : '19.1~ 계속

■ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

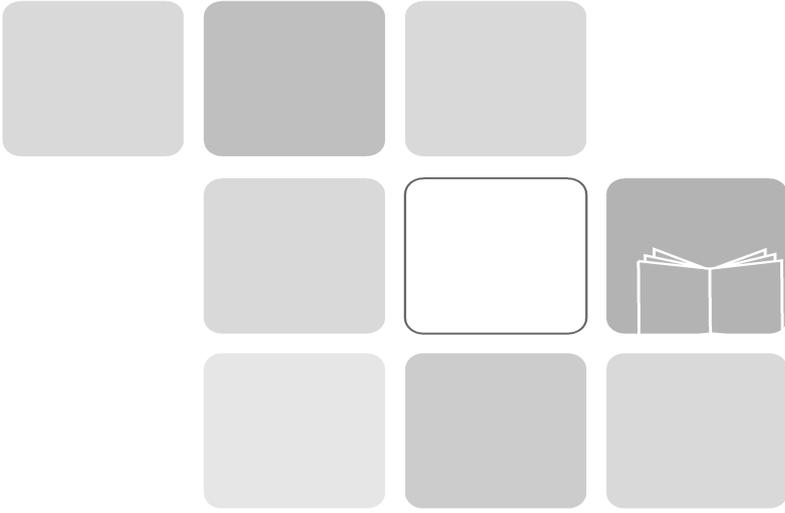

농축산과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[농축산과]

1. 총 평

- 6차산업의 고부가가치 산업 육성을 통해 농가소득증대 기여
- 도시민 남해정착 지원 프로그램을 통한 귀농귀촌 활성화 도모
- 가격안정기금 조성사업 추진을 통해 농가의 안정적인 수익 보장체계 구축
- 특산물 판매장 건립을 통한 보물섬 남해 관광허브센터 역할 주도
- 축산업 환경 개선 및 생산비 절감을 위한 축산종합지원센터 운영 추진중

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
6	1	-	5	5	-	-	-

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약 사업 명	추진율(%)
농축 산과 (6)	유통지원팀	1-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상 (10)
	귀농기획팀	1-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	정상 (60)
	농업정책팀	1-13-13	가격안정기금 조성(농축산물 가격안정기금 조성)	정상 (30)
			가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)	정상 (30)
	유통지원팀	1-14-14	특산물판매장 건립	완료
	축산정책팀	1-16-16	축산종합지원센터 운영	정상 (30)
	가축방역팀	1-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	정상 (5)

나. 세부내용

완료

관리번호	제 목	완료연월일
I-14-14	특산물판매장 건립	2018.8.31.

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	-	10%
I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	-	60%
I-13-13	가격안정기금 조성	-	30%
	가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)	-	30%
I-16-16	축산종합지원센터 운영	-	30%
I-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	펫푸드 생산주체 선정	5%

관리번호	I-10-10														
공약명	농축산 6차산업 집중 육성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10%
주관 부서	농축산과		담당팀		유통지원팀		담당자		최경묵		전화번호		860-3912		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용
 - 공공형 학교급식지원센터 건립 1개소/660m²/2,000백만원
 - 농산물 가공산업 육성 2개소/충진기, 포장재/219백만원
 - 농산물종합가공센터 설치 1개소/432m²/1,400백만원('18년 400, '19년 1,000)
 - 농가맛집 육성시범 1개소/50백만원
 - 향토음식 자원화 품질향상시범 1개소/30백만원
- 사 업 비 : 3,699백만원(국비 500, 도비 1,234, 군비 1,856 민자 109)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,699	0	400	3,299	0	0	0	0
국 비	500	-	200	300	-	-	-	-
도 비	1,234	-	60	1,174	-	-	-	-
군 비	1,856	-	140	1,716	-	-	-	-
민자등	109	-	-	109	-	-	-	-

■ 추진상황(실적)

- 공공형 학교급식지원센터 건립
 - 2018년 8월 : 사업신청
 - 2018년 12월 : 사업대상자 확정
- 농산물 가공산업 육성
 - 2018년 8월 : 사업신청
 - 2018년 12월 : 사업대상자 확정

- 농산물종합가공센터 설치
 - 2018년 2 ~ 7월 : 농산물종합가공센터 운영 업무협회(마늘연구소/2회)
 - 2018년 3 ~ 7월 : 농산물종합가공센터 공정 레이아웃 용역 추진
 - 2018년 10 ~ 12월 : 농산물종합가공센터 설계용역 계약 및 추진
- 농가맛집 육성시범
 - 2018년 8월 : 사업신청
- 향토음식 자원화 품질향상 시범
 - 2018년 8월 : 사업신청

■ 향후계획

- 공공형 학교급식지원센터 건립
 - 2019년 1 ~ 3월 : 기본 및 실시설계 및 인허가등 건축허가
 - 2019년 4 ~ 5월 : 도 계약심사 및 공사 입찰
 - 2019년 6 ~ 11월 : 공사 착공 및 준공
- 농산물 가공산업 육성
 - 2019년 2월 : 보조금 교부결정
 - 2019년 3 ~ 4월 : 사업추진 및 완료
- 농산물종합가공센터 설치
 - 2019년 1월 : 기본 및 실시설계 준공
 - 2019년 3 ~ 10월 : 시공업체 계약 및 공사추진
 - 2019년 8 ~ 12월 : 농산물 가공교육 운영
 - 2019년 10월 : 농산물종합가공센터 공사 준공 및 가공장비 구축(건조기 외 65종 110대)
 - 2019년 10 ~ 12월 : 농산물종합가공센터 시범운영
- 농가맛집 육성
 - 2019년 1 ~ 3월 : 사업홍보 및 신청, 대상자 선정
 - 2019년 4 ~ 12월 : 메뉴 개발 및 레시피 표준화 등 사업 추진 및 완료
- 향토음식자원화품질향상
 - 2019년 3 ~ 4월 : 사업대상 선정 및 보조금 교부결정
 - 2019년 5 ~ 11월 : 시설개선 및 물품구입 등 사업추진 및 완료

관리번호	I-11-11														
공약명	귀농·귀촌인 남해정착 지원														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				60
주관 부서	농축산과		담당팀		귀농귀촌팀		담당자	공현중	전화번호		860-3977				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업내용
 - 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 아카데미 운영
 - 귀농귀촌인 안정정착 및 지역민과의 교류 지원
 - 귀농인의 집 확대 조성, 귀농귀촌 인력풀 운영
- 사 업 비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,620	0	320	500	700	700	700	700
국 비	1,655		145	230	320	320	320	320
도 비	310		30	40	60	60	60	60
군 비	1,655		145	230	320	320	320	320
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 도시민 보물섬 그린팜 투어
 - 서울·경기 1회, 부산·경남 1회
- 2018년 11월
 - 귀농귀촌 사랑방 운영(권역별 2개 읍면)
 - 현장실습형 귀농교육 실시
 - 귀농귀촌 아카데미(황토 구들농기)
- 2018년 12월 : 6차산업화 선진지 견학(김해시 일대)

■ 향후계획

- 귀농귀촌인 유치 프로그램 운영
 - 보물섬 그린팜 투어 운영 및 귀농귀촌 아카데미 운영
 - 영농철 선도농가 농촌체험프로그램 운영
 - 초보농부 이끔이 후견인제 운영
 - 귀농귀촌 페스티벌 및 안정정착을 위한 인문학 교육

■ 문제점 및 대책

- 귀농귀촌 아카데미 및 교육의 다양화 필요
 - ⇒ 교육 프로그램 운영 후 교육수요 파악 후 교육에 반영
- 귀농귀촌 정책 및 교육 등 홍보 필요
 - ⇒ 월2회 귀농귀촌 홈페이지 최신화 실시

관리번호	I -13-13														
공약명	가격안정기금 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○	○						30
주관 부서	농축산과		담당팀		농업정책팀		담당자		윤정인		전화번호		860-3908		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용
 - 농축산물 가격안정 저리융자금 지원
 - 시금치 생산 농자재(포장재 및 비료) 지원
- 사 업 비 : 5,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,720	0	0	180	680	680	680	3,500
국비	0							
도비	0							
군비	5,360			90	590	590	590	3,500
민자등	360			90	90	90	90	

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 예산 확보(비료지원/30백만원) 및 기초자료 수집

■ 향후계획

- 2019년 1월 : 사업계획 농가통보 및 사업추진 협의
- 2019년 2월 : 비료(미량요소제) 사업대상자 선정 및 사업착수
- 2019년 2 ~ 4월 : 농축산물 가격안정기금 여론수렴 및 관계기관 협의
- 2019년 5 ~ 8월 : 기금의 조성 및 운용계획 수립
- 2019년 9 ~ 10월 : 기금의 조성 설치 및 운용조례 제정
- 2020년 이후 : 기금조성 및 운용

관리번호	I -13-13														
공약명	가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30
주관 부서	농축산과		담당팀		농업정책팀		담당자	윤정인	전화번호		860-3908				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 선급금(월급) 지급에 따른 이자 보전
- 사업비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	940	0	0	40	150	250	250	250
국비	0							
도비	0							
군비	940			40	150	250	250	250
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 계획안 및 조례 제·개정
- 2018년 12월 : 군비 40백만원 예산 확보(사무관리비 3백만원 포함)

■ 향후계획

- 2019년 1월 : 농어업인 월급제 추진계획 수립
- 2019년 2월 : 금융기관과 업무협약 체결
- 2019년 3 ~ 4월 : 농협출하약정체결 및 보조금 교부결정
- 2019년 4 ~ 10월 : 농업인 월급 지급
- 2019년 11월 : 금융기관 용자지원 정산 및 지자체 이자 지급

■ 문제점 및 대책

- 2019년 본예산 편성시 의회 의원의 명칭 문제 대두(김창우 의원)
 - 남해군의 경우 겨울작물 재배(마늘, 시금치)로 연중(10~4월) 자금 회전이 가능하여 월급제 필요성이 미미하며 명칭도 이자보전적인 성격으로 월급제의 명칭은 맞지 않다는 주장으로 오히려 농업인의 재해보험으로 지원 건의
- ⇒ 전국의 자지단체는 농업인월급제 명칭을 사용하고 있음
 - 명칭변경 검토 : 농업인월급제(농가경영자금이자보전, 농산물대금선급제)
 - ※ 지원근거 : 2018년 8월 18일 지원조례 개정시 『농업인월급제 지원사업』으로 명칭 변경시 조례개정이 필요함

관리번호	I -14-14														
공약명	특산물판매장 건립														
사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100
주관부서	농축산과		담당팀		유통지원팀		담당자	최경묵	전화번호		860-3912				

■ 사업개요

- 위치(대상) : 삼동면 동부대로 1287
- 사업기간 : 2018년
- 사업내용 : 특산물판매장 1개소/191.5m²(2층)
- 사업비 : 363백만원(도비 80, 군비 283)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	363	0	363	0	0	0	0	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	80	-	80	-	-	-	-	-
군비	283	-	283	-	-	-	-	-
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 특산물판매장 준공 및 사용수익하기(동천마을회(2년) 38만원/월)
- 특산물 판매장 운영 : 멸치액젓 외 60개 품목

■ 향후계획

- 사후관리 철저

관리번호	I-16-16														
공약명	축산종합지원센터 운영														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○					○	○				○				30
주관 부서	농축산과		담당팀	축산정책팀			담당자	김성주	전화번호	860-3918					

■ 사업개요

- 위치 : 남해읍 평리 1183(면적:14,896㎡) 현 축협가축경매시장 부지 내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용 : 축산종합지원센터 신축 및 운영
- 사업비 : 5,086백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	5,086	0	900	586	600	3,000	0	0
국비	1,043		450	293	300			
도비	1,732		54	88	90	1500		
군비	541		126	205	210			
민자등	1,770		270			1500		

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11월 : 900백만원(국비50%,도비6%,군비14%,자담 30%)
- 가축전자경매시장 888㎡/1동, 식육포장처리시설 259㎡(축협한우판매장)

■ 향후계획

- 2019년 : 축산종합방역소 건립 1동 / 586.4백만원
- 2019년 8월 : 환경개선제 제조시설 건립 국비(군특)사업 신청
- 2020 ~ 2021년 : 환경개선제 제조시설 건립

■ 문제점 및 대책

- 사업부지 확보 : 10,900㎡(3,297평)
⇒ 주변 잔여부지 추가 매입 : 남해축협

관리번호	I -21-21														
공약명	수산 부산물 반려동물 사료 생산														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				5
주관 부서	농축산과		담당팀		가축방역팀		담당자		김도		전화번호		860-3972		

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 수산 부산물 반려동물 사료 생산을 위한 펫푸드 사료생산공장 건립
- 사 업 비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	500				500			
민자등	500				500			

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 기존 펫푸드 생산 업체 조사 중

■ 향후계획

- 2019년 1 ~ 6월 : 생산 주체 선정(협력 기업체 선정)
- 2019년 7 ~ 12월 : 세부 추진 계획 협의 및 수립
- 2020 ~ 2021년 : 신규 건립 또는 협력 체계 구축 완료

■ 문제점 및 대책

○ '수산 부산물 활용 펫푸드 생산 주체' 선정

- 신규 시설 건립 · 운영

· 재정적 측면

: 사료관리법에 의한 시설 기준을 갖추어야 함에 따라 최소 20억원 이상의 사업비가 필요하며, 현재 국도비 사업 중 사료 제조업 건립 보조금은 없는 실정으로 수협이나 일반인이 건립·운영하기에는 어려움이 예상되며, 지자체 민간자본보조사업으로 추진함에 있어서도 많은 준비(50% 보조 시 10억원 이내) 예산이 소요되는 문제가 있을 것으로 판단됨

· 기술적 측면

: 사료 생산에 있어 배합 비율, 위생관리기준, 유통망 확보 등의 기술적 측면에서도 일반인이 운영하기에는 어려움이 있다고 판단됨

⇒ 기존 펫푸드 생산 업체와의 협력 체계 구축

· 재정적인 측면과 기술적 측면의 문제점을 동시에 해소하고 안정적인 유통망 확충도 가능

○ 공약사업 추진 협력 체계 구축


- 펫푸드 R&D·생산 지원 : 해양수산과 협조

· 단순 펫푸드 생산이 아닌 수산물 및 수산 부산물을 활용한 펫푸드의 생산으로서 수산물 및 수산 부산물의 이해도가 높은 해양수산과와의 협조 체계 구축

- 홍보 · 마케팅 지원 : 농축산과 가축방역팀

· 기존 펫푸드 생산업체 및 동물단체·남해군 간 협의체 구성, 펫푸드 홍보, 반려동물 박람회 참여 지원 등의 홍보·마케팅 업무 지원

※ 신규 건립 또는 기존 업체 활용 등의 기본 추진 방향 설정 후 반려동물 체험마을 조성, 반려동물 공원 조성 등 '반려동물 산업 종합 발전 계획' 수립 필요



농촌활력과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[농촌활력과]

1. 총 평

- 공약사업 수행을 위한 예산투입, 계획수립이 완료되었으며, 2~3월 중 사업신청지 현지 실태조사 후 심의를 거쳐 사업 대상 확정 및 사업 추진 가능
- 사업 초기 신속 추진하여 기간 내 공약이행 목표 달성 가능

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
2	0	0	2	2	0	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
농촌 활력 과 (2)	농촌자원팀	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	정상(10)
	농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	정상(10)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	없음	10%
IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	없음	10%

관리번호	I-15-15														
공약명	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○			○			○				○				10
주관 부서	농촌활력과		담당팀		농촌자원팀		담당자		김미선		전화번호		860-3946		

■ 사업개요

- 사업량 : 1개소(연구회, 작목조직, 법인 등 생산자단체)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(2년간)
- 사업내용 : 농촌자원을 이용한 치유농업 프로그램 개발과 운영
 - 치유농업 프로그램 운영에 필요한 시설 등 환경조성
 - 전문가 컨설팅 및 치유농업 프로그램 개발 등
 - 공동체 소통 공간 및 경관 조성으로 네트워크 구축
- 사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	200	0	0	100	100	0	0	0
국비	0							
도비	100			50	50			
군비	100			50	50	0	0	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 농촌치유자원상품화 사업 활성화워크숍 참석
- 2018년 12월 : 관내 치유자원 보유 사업장 실태조사 및 계획수립
- 2019년 1월 : 사업계획 수립 및 홍보

■ 향후계획

- 2019년 1~3월 : 신청지 실태조사 및 심의를 통한 사업대상 선정
- 2019년 4~10월 : 치유프로그램 컨설팅 및 프로그램 개발
- 2019년 5월 : 사업대상자 치유프로그램 역량강화 교육
- 2019년 6~12월 : 치유농장 환경 조성 등 사업추진 및 완료

관리번호	IV-12-74														
공약명	마을 공동급식 지원 확대														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○			○			○				○				10
주관 부서	농촌활력과		담당팀		농촌자원팀		담당자		김도은	전화번호		860-3948			

■ 사업개요

- 사업량 : 48개소(현지 실태조사 후, 사업량 변동가능)
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월(1년간)
- 사업내용 : 마을공동급식 운영을 위한 인건비, 부식비 확대지원
 - 인건비 단가 : '18년 40천원/일 → '19년 50천원/일
 - 부식비 단가 : '18년 40천원/일 → '19년 50천원/일
 - 급식참여자가 30명 이상인 마을에 대하여 보조인건비 추가 지원
- * 보조인건비 단가 : 25천원/일
- 사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	826.8	0	76.8	150	150	150	150	150
국비	0							
도비	42.12		6.12	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
군비	784.68		70.68	142.8	142.8	142.8	142.8	142.8
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 8월 : 마을공동급식 지원 확대 계획 수립 및 선결
- 2018년 9월 : 2019년 사업 수요조사 및 결과 예산 반영
- 2019년 1월 : 사업계획 수립 및 홍보

■ 향후계획

- 2019년 1~3월 : 신청마을 실태조사, 심의를 통한 사업대상 선정
- 2019년 4~11월 : 마을별 사업추진 및 급식 현지확인
- 2019년11~12월 : 사업정산 및 완료, 평가 등 실시

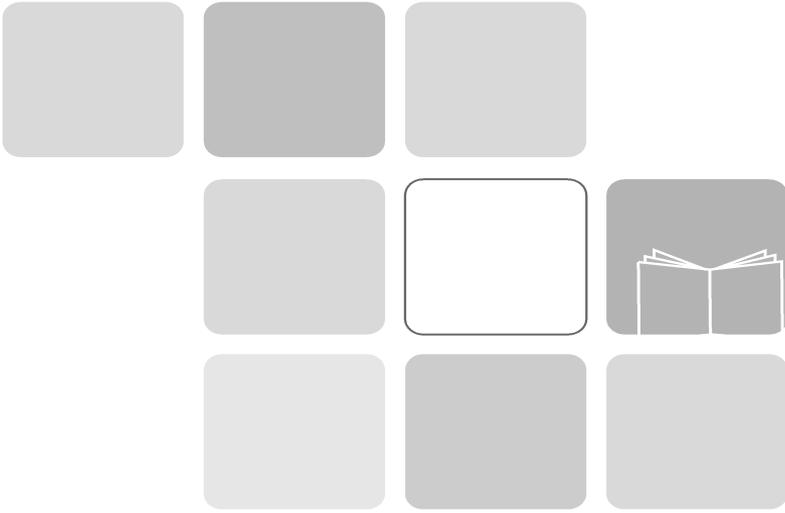

농업기술과

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[농업기술과]

1. 총 평

- 공약사업 추진을 위한 사업비 확보 및 실행계획 수립 등 구체적 사업추진 진행
- 현장농민 참여 공동 R&D 추진을 통해 지역농업 선도 강소농 육성 및 1차산업 부가가치 확대에 기여.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3			3	3			

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
농업 기술 과 (3)	원예작물팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	정상(10%)
	마늘팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	정상(10%)
	원예작물팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	정상(10%)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)		10%
I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화		10%
I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)		10%

관리번호	I -10-10														
공약명	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)														
사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	농업기술과		담당팀		원예작물팀		담당자	천상용	전화번호		860-3967				

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~2022년
- 사업내용 : 기존 시설하우스 농가에 스마트팜 시설 지원
- 사 업 비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	160	0	0	40	40	40	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	120			30	30	30	30	
민자등	40			10	10	10	10	

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 2019년 예산확보 및 사업계획 수립
- 2019년 1월 : 사업계획 농가통보 및 신청 접수

■ 향후계획

- 사업대상자 선정 및 사업착수 : 2019년 2월
- 사업완료 및 사업비 정산보고 : 2019년 4~6월

관리번호	Ⅱ-12-12														
공약명	마늘연구소 R&D 역량강화														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	농업기술과		담당팀		마늘팀		담당자		이성호	전화번호		860-3942			

■ 사업개요

- 위치 : 이동면 남해대로 2465-8(면적 : 10,574m²)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 마늘연구소 R&D 역량강화
- 사업비 : 4,520백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	4,520	0	0	1,130	1,130	1,130	1,130	0
국비	0							
도비	0							
군비	4,520			1,130	1,130	1,130	1,130	
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 11월
: 현장농민 지원을 위한 연구개발 및 생산지원 계획 수립

■ 향후계획

- 2019년 1~2월 : 아이디어 공고 및 지원 대상자 선정
- 2019년 3~8월 : 연구개발(효능분석, 공정개발 등)
- 2019년 9~12월 : 제품화(생산지원), 보고서 작성

관리번호	I -13-13														
공약명	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	농업기술과		담당팀		원예작물팀		담당자	천상용	전화번호	860-3967					

■ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~2022년
- 사업내용 : 시금치 생산 농자재(포장재 및 비료) 지원
- 사 업 비 : 720백만원

(단위 : 백만원)


구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	720	0	0	180	180	180	180	0
국비	0							
도비	0							
군비	360			90	90	90	90	
민자등	360			90	90	90	90	

■ 추진상황(실적)

- 2018년 12월 : 2019년 예산확보(비료지원/30백만원)
- 2019년 1월 : 사업계획 농가통보 및 사업추진 협의

■ 향후계획

- 비료(미량요소제) 사업대상자 선정 및 사업착수 : 2019년 2월
- 시금치 포장재 지원 예산 확보(1회 추경) : 군비 60백만원

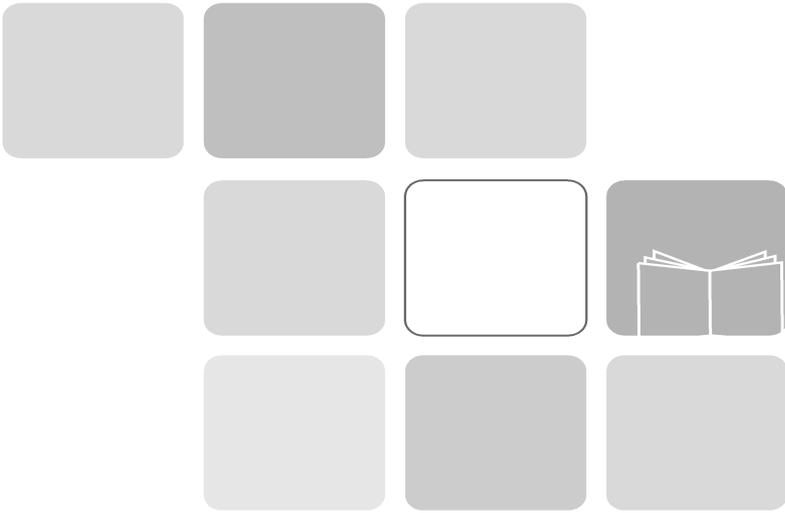

체육시설사업소

공약사항 추진실적(2018.12.31 기준)

[체육시설사업소]

1. 총 평

- 군민들의 다양한 문화·체육활동의 수요를 충족시켜 군민들의 체력 단련 및 지역 경제 활성화 도모를 위한 “상주체육공원 실내체육관 건립”, “파크골프장 조성” 사업은 정상 진행중이며
- 장애인들의 체육시설을 위한 “남해 온누리 스포츠센터 건립” 사업은 예산 및 부지확보의 어려움과 유지관리에 많은 예산이 소요될 것으로 판단됨에 따라 국민체육센터를 활용하여 다양한 동아리 활동 및 프로그램 조성으로 대체할 예정
- 드론교육 관련 업체 견학 및 남해대학 교수 자문을 통해 효율적인 드론교육센터 건립·운영 방안을 모색하고 추진 방향을 설정하는 등 정상추진하고 있음.

2. 총괄 (단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
4	0	0	4	4	0	0	0

가. 추진현황

부서	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
체육시설 사업소 (4건)	레포트팀	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	정상(10)
	체육시설팀	II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(10)
	체육시설팀	III-18-62	파크골프장 조성	정상(10)
	체육시설팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립	정상(0)

나. 세부내용

추진중(정상)

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	없음	10%
II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	없음	10%
III-18-62	파크골프장 조성	없음	10%
IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)	남해군국민체육센터 시설 내 장애인 온누리 스포츠센터로 운영 변경	0%

관리번호	Ⅱ-2-27														
공약명	드론 교육훈련센터 운영														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				10
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		레포트팀		담당자		강영후		전화번호		860-8674		

■ 사업개요

- 위 치 : 서면 스포츠파크 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용 : 드론 전문교육기관 지정, 드론 체험장,
드론 스포츠 경기장 등 조성
- 사 업 비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년이후
계	500	0	0	30	100	100	270
국비 도비 군비 민자등	500			30	100	100	270

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 남해대학 항공정비과 심종채 교수님 방문
- 2018년 11월 : 2018 코리아 드론축구 페스티벌 참관(전주대학교)
- 2018년 12월 : (주)날다 방문(광양시, 국토부 지정 전문교육기관)
- 2018년 12월 : (주)날다 스포츠파크 방문
- 남해군 전문교육기관 설치 가능 장소 현지 확인

■ 향후계획

- 2019년 1~6월 : 드론교육센터 건립 기본계획 및 타당성 조사 용역

- 2019년 하반기 : 무인비행장치산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정
- 2019년 하반기 : 드론 스포츠 대회 개최
- 2020년 이후 : 드론 교육훈련센터 조성 및 운영
 - 교육시설(강의실, 실기교육장, 비행장 등)
 - 드론 체험장(가족, 학생, 어린이 대상 드론 체험 및 비행캠프 진행)
 - 드론 스포츠 경기장(축구장, 레이싱장 등)

소관부서	관리번호	공약사업명	추진율(%)
레포트팀	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	정상(10)
체육시설팀	II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(10)
체육시설팀	III-18-62	파크골프장 조성	정상(10)
체육시설팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립	정상(0)

관리번호	II-15-40														
공약명	상주체육공원 실내체육관 건립														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		체육시설팀		담당자		김의수		전화번호		860-8666		

■ 사업개요

- 위치 : 경남 남해군 상주면 상주리 1872번지 외 16필지
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년
- 사업내용
 - 체육시설(2층) : 다목적 체육관(규모2,000m²)
 - 부대시설(1층) : 헬스장 1식, 샤워장, 화장실 등
- 사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	7,000	0	0	20	300	1,000	2,180	3,500
국비	3,000					500	1000	1500
도비	0							
군비	4,000			20	300	500	1180	2000
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 2018년 10월 : 대상필지 소유자 확인 등 현황파악
- 2018년 11월 : 사업추진 계획 수립
- 2018년 11월 : 중기재정 계획 수립

■ 향후계획

- 기본계획 및 타당성조사 용역 : 2019. 상반기
- 공유재산관리 계획에 따른 의회 승인 : 2019. 12.
- 감정평가 및 토지보상(2,705m²) : 2020. 상반기
- 지방재정투자 심사 : 2020. 상반기
- 사업공모 및 국비(기금) 신청 : 2020. 하반기
- 실시설계 용역 및 착공 : 2021. ~ 2023.

관리번호	Ⅲ-18-62														
공약명	파크골프장 조성														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				10
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		체육시설팀		담당자		김의수		전화번호		860-8666		

■ 사업개요

- 위치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.
- 사업내용
 - 규모 : 9홀, 7,000m²
- 사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	3,000	0	0	20	300	280	400	2,000
국비	900				0	0	100	800
도비	0							
군비	2,100			20	300	280	300	1200
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 사업추진 계획 수립 : 2018. 10.
- 중기 지방재정 계획 수립 : 2018. 11.

■ 향후계획

- 기본계획 및 타당성조사 용역 : 2019. 상반기
- 공유재산관리 계획에 따른 의회 승인 : 2019년 하반기
- 감정평가 및 토지보상 : 2020년 상반기
- 투융자심사 : 2020년 상반기
- 사업공모 및 국비(균특)신청 : 2020년 하반기
- 실시설계 용역 및 착공 : 2022년 ~ 2025년

관리번호	IV-2-64														
공약명	남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)														
사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				0
주관 부서	체육시설사업소		담당팀		체육시설팀		담당자		김의수		전화번호		860-8666		

■ 사업개요

- 위 치 : 경남 남해군 남해읍 화전로 78번길 26 남해국민체육센터
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용
 - 수영시설 : 수중 자전거, 아쿠아로빅 프로그램 운영
 - M K 홀 : 장애극복 프로그램 및 장애인 동아리 활동 등
- ※ 남해군 장애인 체육회 구성으로 스포츠센터 연계추진
- 사 업 비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18년도	'19년도	'20년도	'21년도	'22년도	'23년이후
계	100	0	0		100	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	100				100			
민자등	0							

■ 추진상황(실적)

- 타지자체 시설 장애인 스포츠 프로그램 조사 : 2019년 상반기
- 남해온누리 스포츠센터 건립(군수공약) 사업을 기존시설(국민체육센터)을 활용, 남해온누리 스포츠센터 운영으로 변경추진

■ 향후계획

- 타지자체 시설 견학 : 2019년 상반기
- 세부사업계획 수립 : 2019년 하반기
 - 장애인 우선사용 대관(조례개정)
 - 장애인 배려공간 지정 운영(장애인 사용시설 지정)
 - 장애인 생활체육교실 사업 확대 등
- 장애인 프로그램 운영 홍보 : 2020년 상반기
- 장애인 운동기구 구입 및 시설 보완 : 2020. 하반기
- 장애인 스포츠센터 운영 : 2020년 하반기 ~ 계속

(제정) 2010.06.25 훈령 제 261호

남해군 군수 선거공약 관리규정

제1조(목적) 이 규정은 군수가 선거 과정에서 군민들과 약속한 내용을 효율적으로 이행하고 체계적으로 관리하기 위하여 실천계획의 수립과 추진 상황의 점검, 공약이행 평가 및 공개 등에 필요한 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "주관부서"란 소관 공약사항을 담당하여 추진하는 부서를 말한다.
2. "관계부서"란 주관부서의 요청에 따라 공약사항의 추진과 관련하여 협조 책임이 있는 부서를 말한다.

제3조(적용) 이 규정은 군 본청 및 그 소속 기관에 적용한다.

제4조(기본방침) 선거공약은 군민과의 약속이라는 인식하에 군정의 최우선 과제로 추진하여야 한다.

제5조(관리체계) ① 공약사항의 총괄관리 및 조정은 기획감사실장이 하고 사업별로 관리번호를 부여하며 이를 전산화하여 관리한다.

② 주관부서의 장은 소관 공약사항을 수행하며, 각 단위사업별로 담당을 지정하여 효율적으로 추진한다.

제6조(공약사항의 확정) ① 기획감사실장은 공약사항 주관부서로부터 공약사항 실천 가능성 등 별지 제1호서식의 검토의견서를 받아야 한다.

② 주관부서의 장은 제1항에 따른 공약사항의 실천가능성 등을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 법률적 검토(조례 제·개정을 포함한다)
2. 실천가능 여부
3. 투자 소요액 및 연도별 재원 조달 계획

4. 임기 내 추진이 어려운 경우 장기계획으로 추진 가능 여부

5. 그 밖에 공약사항 추진에 필요한 제반사항 등

③ 공약사항의 최종확정은 주관부서의 의견을 반영하여 취임 후 60일 이내에 남해군정 조정위원회에서 결정한다.

제7조(실천계획의 수립) 주관부서의 장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 공약사항별로 별지 제2호서식의 공약사항 실천계획을 작성하여 군수의 결재를 받은 후 기획감사실장에게 제출하여야 한다.

1. 공약취지에 부합되어야 하며 실천 가능한 목표 설정

2. 정확한 현황 분석과 전망 예측

3. 국가 및 경상남도 계획과의 연계 및 조화

4. 사업기간별 효율적인 실천방안 강구

5. 예상되는 문제점 검토 및 대책 강구

6. 예산이 수반되는 사업은 연도별 투자계획을 수립하고, 예산부서와 사전 협의 및 자원 조달방안 강구

7. 법제, 조직 및 인력이 필요할 경우에는 관계부서와 사전 협의

제8조(실천계획의 변경) 주관부서의 장은 상황과 여건의 변화에 따라 실천계획의 변경이 필요한 때에는 기획감사실장의 협의를 거쳐 군수의 결재를 받은 후 변경할 수 있다.

제9조(연도별 추진계획 작성) 주관부서의 장은 실천계획을 근거로 매 연도 초에 별지 제3호서식의 연도별 추진계획을 작성하여 추진하여야 한다.

제10조(추진상황 점검) ① 주관부서의 장은 소관 공약사항의 추진실적을 반기별로 자체 점검을 실시하고, 그 평가결과를 별지 제4호서식으로 매 반기 다음 달 10일 까지 기획감사실장에게 제출하여야 한다.

② 기획감사실장은 제1항에 따라 주관부서의 장이 제출한 자체 점검결과에 대하여 종합적인 평가를 실시하고, 그 평가에 부진 또는 문제사업이 있을 경우 해당 주관부서의 장에게 시정, 보완, 개선 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 주관부서의 장은 새울행정시스템에서 공약사항을 관리하여야 한다.

제11조(평가위원회 구성·운영) ① 군수는 공약사항별 추진상황 평가를 위하여 남해군수 선거공약실천평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

② 군수는 평가결과 및 건의사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 공약사항 추진에 적극 반영하여야 한다.

③ 위원회는 남해군 업무평가위원회가 이를 대행한다.

제12조(평가지기) 공약이행 평가는 매년 7월에 실시하되 필요한 경우 평가단에서 그 시기를 정하여 연 1회에 한정하여 추가로 평가할 수 있다.

제13조(평가방법) ① 공약이행 평가는 공약사항에 대하여 당초 취지 및 목표를 이행하였는지를 사업별 진척정도, 사업비 확보, 집행률 등 서류를 근거로 평가하되, 필요한 경우 현장을 확인하여 평가할 수 있다.

② 평가단은 공약이행 평가를 위하여 필요한 경우 관련 공무원 또는 전문가를 참석하게 하여 그 의견을 듣거나 자료의 제공 등 필요한 협조를 요청할 수 있다.

제14조(공개) 공약사항의 확정, 실천계획, 수정 및 변경, 추진상황, 공약이행 평가결과는 남해군 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

제15조(재분류 등) 군수의 임기 만료 또는 궐위된 경우 시행 중인 공약사항은 일반 업무로 재분류하여 계속 추진하고, 시행되지 아니한 공약사항은 추진하지 아니하고 종결 처리한다.


제16조(매니페스토 운동 협조) 군수는 시민단체 또는 언론기관 등이 주관하는 매니페스토 운동에 적극 협조한다.

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

사업별 코드번호

□ 관리번호 부여 체계



□ 상위공약별 코드(I ~ V)

- I : 일자리 만드는 산업경제
- II : 다시찾는 해양관광
- III : 청년이 찾아오는 행복남해
- IV : 더불어 잘사는 보건복지
- V : 군민이 참여하는 지방자치

□ 실행공약별 코드

- 상위공약(5개)에 대한 실행공약 : 각 상위공약별 번호부여

□ 사업일련번호(1~90)

- 선거공보순으로 게재된 일련번호 : 1 ~ 90
